1、(6499)公司的新产品系列将在两个月内发布，95%的项目任务均已完成。但是，管理层却决定终止产品发布并取消项目。 项目经理下一步该怎么做？

A、立即停止所有项目任务

B、按原计划完成项目

C、释放资源并记录项目状态

D、收尾项目并更新经验教训

我的答案：D　参考答案：D

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

2、(6500)在识别五名干系人的干系人分析之后，项目经理现在需要确定项目沟通的复杂性，潜在沟通渠道有多少？

A、20

B、15

C、10

D、5

我的答案：C　参考答案：C

3、(6501)客户希望增加股东权益的总和，提高其在全球市场的品牌知名度。客户的主要目标是什么？

A、为组织战略改善整体业务支持

B、增加营销预算

C、提高业务价值

D、通过重新投资其他业务组合提高市场份额

我的答案：D　参考答案：C

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

4、(6502)

一家全球性公司正处于部署一项产品的项目中途。然而，该产品的制造商发布了一个新版本。新版本必须安装在任何新部署的产品上。该产品的一个关键部件未在新版本上测试。公司希望在10月31日之前，赶在假日购物季时，在所有门店推出这项新产品。额外的测试会将项目的最终完成日期推迟一个月。项目经理应该怎么做？

A、暂停部署，直至10月31日之后，并利用这段时间完成必要的测试

B、向可用资源提交一项变更请求，在新版本中测试并执行

C、更新项目管理计划，包含测试，并修订进度计划，在10月31日之前部署大部分产品

D、在10月31日之前部署产品，并在部署完之后完成测试

我的答案：B　参考答案：B

5、(6503)一个项目拥有固定完工日期。从之前的经验看，该客户以不断要求修改项目可交付成果而出名，这会增加无法满足项目期限的风险。
为避免这个风险，项目经理应该怎么做？

A、执行风险分析并将结果发送给客户，强调无法满足项目期限的高可能性
B、制定一份变更管理计划，要求联合批准变更，并将其提交给干系人批准
C、使用关键路径制定进度计划，并将其提交给客户以证明无变更浮动时间
D、通知客户项目日期不接受任何变更，除非进行合同评审

我的答案：A　参考答案：B

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

6、(6504)重要材料需要运输供应商。如果该材料不能按时交付，项目预算将严重受到影响。为降低这个风险，项目经理购买了保险。项目经理采用了哪一种消极风险策略？

A、规避
B、接受
C、减轻
D、转移

我的答案：D　参考答案：D

7、(6505)项目团队由十名团队成员构成。由于范围增加，后续又增加了两名团队成员。
那么增加了多少条沟通渠道？

A、20
B、21
C、23
D、24

我的答案：B　参考答案：B

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

8、(6506)
在项目实施阶段，项目经理必须沟通范围变更，并获得跨国关键干系人的批准。项目经理应采用下列哪一种沟通方法？

A、推式沟通
B、交互式沟通
C、干系人沟通
D、拉式沟通

我的答案：B　参考答案：B

9、(6507)

由于收集数据的信息系统不稳定，导致项目延期。项目经理制定了一项新策略，在不增加预算的情况下，弥补失去的时间。由于这项策略之前只用过一次，项目经理将其识别为一项重大风险。下列哪份文件应更新？

A、项目管理计划和问题日志

B、风险管理和干系人管理计划

C、变更管理和成本管理计划

D、风险登记册和进度管理计划

我的答案：D　参考答案：D

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

10、(6508)若要项目列表决定优先顺序，高级管理层下一步应该怎么做？

A、审查每个项目的高层次风险

B、评估每个项目的财务回报

C、创建石川图，确定问题原因

D、审查和分析不同的项目章程

我的答案：D　参考答案：B

11、(6509)在开发的最后一天，软件开发团队的项目主管宣布由于意外停电可能导致延期。由于测试时间有限，软件开发主管和测试主管之间展开激烈的讨论。

下列哪一项冲突解决技术将提供长期解决方案？

A、妥协/调解

B、合作/解决问题

C、缓解/包容

D、强迫/命令

我的答案：B　参考答案：B

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

12、(6510)随着项目进展，项目经理预测到即将开展的活动中存在一些风险。项目经理应该使用哪一份文件进行风险分类？

A、风险分解结构

B、风险管理计划

C、风险登记册

D、风险绩效报告

我的答案：C　参考答案：A

13、(6511)团队被分配到去完成一项关键路径上的活动，但可交付成果延迟了。团队成员包括来自项目经理以及客户公司的个人。

为确保项目保持进度计划，项目经理应该使用哪一项来修订进度计划？

A、滚动式规划


B、进度压缩

C、假设情景分析

D、分解

我的答案：B　参考答案：B

14、(6512)项目发起人要求项目经理将项目的总持续时间减少一天。项目经理下一步该

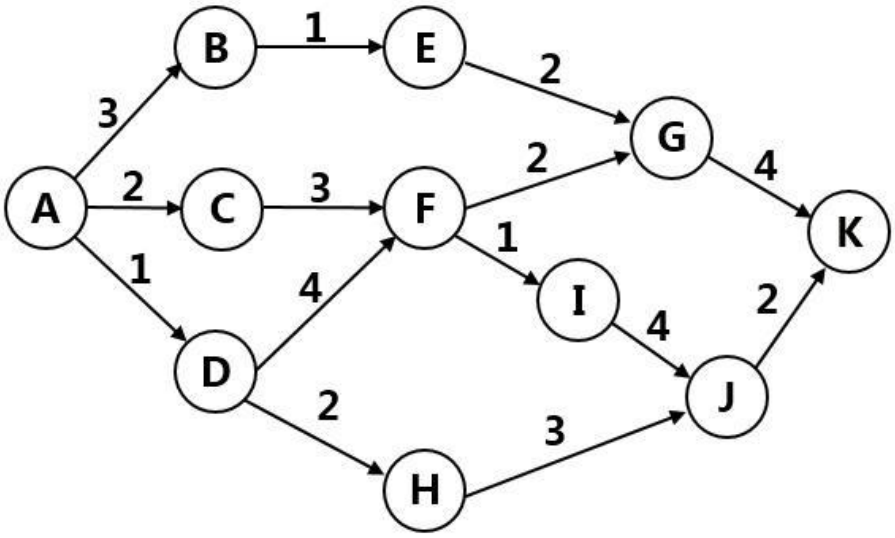

A、对活动I-J赶工一天

B、对活动G-K赶工一天

C、对活动A-B赶工一天

D、对活动H-J 赶工一天

我的答案：A　参考答案：A

15、(6513)项目经理从一个符合进度和预算的项目中辞职。在聘用替代的新项目经理后，团队反对新项目经理提出的意见。

团队处于下列哪一个发展阶段？

A、形成

B、规范

C、成熟阶段

D、震荡阶段

我的答案：D　参考答案：D

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

16、(6514)在过去10个月，在项目实施阶段出现了大量缺陷。新缺陷数量每个月都不同。

项目经理应该参考下列哪一项来确定这些缺陷的趋势？

A、控制图

B、散点图

C、流程图

D、统计抽样

我的答案：A　参考答案：A

17、(6515)在编制项目章程用于批准时，项目经理发现有两名干系人对关键可交付成果的期望有冲突。若要解决期望冲突问题并完成项目章程，项目经理应该首先做什么？

A、与关键干系人一起召开一个问题解决会。

B、将该问题上报给项目发起人。

C、使用专家判断来决定可交付成果。

D、在章程中减少可交付成果用于后期定义。

我的答案：A　参考答案：A

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

18、(6516)

项目经理审查项目需求并与主题专家（SME)面谈。规划项目时，很明确并非所有需求都能满足。

项目经理下一步应该怎么做？

A、与关键干系人确定将满足哪些需求。

B、根据专家判断评价并排列需求的优先顺序。

C、为每个方案制定详细的计划。

D、要求项目团队协助。

我的答案：B　参考答案：B

19、(6517)项目经理召开一次头脑风暴会议，识别在产品测试阶段发现的缺陷原因。项目经理应使用下列哪项工具或技术为这些原因排列优先顺序？

A、名义小组技术

B、帕累托图

C、控制图

D、散点图

我的答案：A　参考答案：A

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

20、(6518)项目经理制作完项目验收文件之后，最终测量指标为：

成本绩效指数（CPI)=1.1

进度绩效指数（SPI)=0.7

完工预算（BAC)=400，000美元

一名关键干系人要求进行重大范围变更。项目经理首先应该怎么办？

A、分析可能的方案以及其他对项目管理计划的影响。

B、与团队开会，讨论变更请求的可行性。

C、拒绝范围变更，因为项目处于收尾阶段。

D、提出变更请求，并与项目发起人沟通紧急情况。

我的答案：A　参考答案：C

21、(6519)有人建议项目经理在信息技术活动中使用龙卷风图。项目团队应该使用什么项目风险管理技术？

A、定性风险分析

B、定量风险分析

C、概率分布

D、预期货币价值分析

我的答案：B　参考答案：B

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

22、(6520)项目经理被任命管理一个将数据中心迁移到新地址的项目。在获得完成项目成功所需的团队之后，项目经理创建了下列哪一项资产？

A、资源日历和项目人员分类

B、团队基本规则

C、团队绩效评估

D、团队的认可与奖励

我的答案：A　参考答案：A

23、(6521)项目进度计划已准备好批准。项目团队正在制作一份具有重要可交付成果的文件。项目经理正在制作下列哪一份文件？

A、里程碑图

B、甘特图

C、横道图

D、工作分解结构

我的答案：A　参考答案：A

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

24、(6522)项目经理询问一个正在进行当中，跨越不同地理位置项目的情况。项目经理无法及时获得团队成员的状态更新。结果，项目经理无法按照项目发起人的期望，定期沟通项目状态情况。

项目经理首先应该怎么做？

A、向团队成员沟通报告期望。

B、审查沟通管理计划。

C、发起与团队成员的一对一沟通。

D、将这个情况作为一项风险记录在风险登记册中。

我的答案：B　参考答案：B

25、(6523)项目经理完成了一个新产品开发项目的规划过程。在继续进入执行过程组之前需要完成的最后一个重要里程碑是什么？

A、最终确定项目章程

B、接收执行项目的项目资金

C、获得发起人和干系人的批准

D、执行干系人管理策略

我的答案：C　参考答案：C

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

26、(6524)一个新的政府法规将要求对一个处于开发阶段的产品进行变更。项目团队在项目开始时修订项目管理计划用以实施新的需求，而非在后期添加需求。

这应该使用的是什么类型的变更请求？

A、纠正措施

B、主动措施

C、预防措施

D、更新措施

我的答案：C　参考答案：D

27、(6525)在项目执行期间，一名外部干系人反对一项重大范围变更。除非重新评估干系人的决定，否则项目进展将受到影响。

项目经理下一步该怎么做？

A、审查干系人管理计划评估影响

B、请求项目发起人解决干系人的问题

C、修订预算，反映可选方案的成本

D、调查干系人反对背后的理由

我的答案：A　参考答案：D

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

28、(6526)在发起人批准项目后，任命了项目经理。项目经理应首先审查下列哪一项？

A、供应商合同

B、经批准的项目章程

C、批准项目预算

D、客户需求

我的答案：B　参考答案：B

29、(6527)职能经理参加了一个实施新会计系统的项目启动大会，并安排组织内的资源在一个月后开始项目任务。职能经理又将这些资源又分配给公司内的另一个项目。项目经理尝试联系职能经理，但没有收到任何反应。项目经理首先应使用下列哪一项管理技能？

A、解决冲突

B、促进对项目目标达成一致同意

C、影响人员支持项目

D、克服阻力改变

我的答案：B　参考答案：A

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

30、(6528)一个建造一家新医院的项目正在进行中。一名项目干系人要求项目提供所有相关项目文件。项目经理有一份文档，其中包含各种文件以及组成项目管理计划的各项从属计划。
项目经理应该向该干系人提供哪些文件。

A、配置管理计划、工作分解结构（WBS）、成本基准、进度基准

B、活动成本估算、变更请求、风险登记册、质量测量指标

C、范围基准、干系人登记册、项目日历、里程碑清单

D、项目章程、问题日志、风险管理计划、采购工作说明书（SOW）

我的答案：C　参考答案：B

31、(6529)一家公司开始一个IT项目，部署一个新系统。在执行阶段，项目经理意识到项目超出了进度，并且没有额外的预算。
项目经理应使用下列哪一项技术来解决进度差距？

A、资源平衡

B、假设情景分析

C、赶工

D、快速跟进

我的答案：D　参考答案：D

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

32、(6530)在一个软件开发项目中，项目经理确定执行满足产品质量要求所需的全面测试是不可能的。项目经理应使用哪一项工具来识别哪些软件元素是大部分问题的主要原因？

A、直方图

B、散点图

C、帕累托图

D、控制图

我的答案：C　参考答案：C

33、(6531)

项目经理在项目状态报告中包含有关分包商工作的质量审计报告。项目经理应使用哪一种工具或技术？

A、工作分解结构

B、专家判断

C、合同变更控制系统

D、采购绩效评审

我的答案：D　参考答案：D

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

34、(6532)

一名团队成员在项目执行阶段报告了一个之前被记录为一个风险的问题。项目经理下一步该怎么做？

A、与客户召开一次会议讨论问题及其影响

B、实施定量风险分析并通知所有干系人

C、记录问题并与团队审查沟通管理计划

D、执行风险应对计划，然后重新评估剩余风险

我的答案：D　参考答案：D

35、(6533)项目经理和项目团队已在公司成功实施一个新的产品线，目前正处于收尾过程。项目经理已经获得内部客户的验收，并开展审查和记录经验教训。

为完成该项目，应创建哪一份文件？

A、项目管理计划更新和最终产品

B、最终产品和组织过程资产更新

C、范围基准和最终产品

D、成本绩效基准和最终产品

我的答案：B　参考答案：B

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

36、(6534)一个制造项目预期每周将交付100，000件产品。周缺陷率不大于0.01%。在过去四周，测量到的缺陷率是0.3%、0.1%、1%和0.45%。项目经理集合了一支专家队，判定原材料不满足质量技术规范。团队决定将有必要修订原材料检查过程。

项目经理应该如何处理这项信息？

A、执行优势、劣势、机会与威胁（SWOT)分析。

B、提出变更请求。

C、请求额外的质量资源。

D、开展一致成本研究。

我的答案：D　参考答案：B

37、(6535)赶工期间需要遵循的两个主要原则是什么？

A、对非关键路径上以及赶工成本最少的活动赶工

B、对关键路径上以及赶工成本最少的活动赶工

C、对关键路径上以及赶工成本最多的活动赶工

D、对非关键路径上以及赶工成本最多的活动赶工

我的答案：B　参考答案：B

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

38、(6536)项目经理被任命管理一个将开始实施阶段的现有项目。在查看规划文件时，发现一些需求并未如范围说明书的定义包含在内。

项目经理下一步该怎么做？

A、在工作分解结构中补充了遗漏的需求。

B、修订范围说明书并开始执行。

C、遵循整体变更控制过程中定义的步骤。

D、与发起人开会重新定义产品需求。

我的答案：C　参考答案：C

39、(6537)在定期状态报告期间，项目经理得知一个关键路径上的项目任务交付将落后于进度计划。项目经理应该怎么做来保持进度计划。

A、使用德尔菲技术。

B、重新计算关键路径。

C、快速跟进进度计划。

D、赶工。

我的答案：C　参考答案：D

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

40、(6538)在升级新电信系统当中，项目团队发现新软件补丁可能在特定环境下的有效运行期间造成不稳定性。接收到这个信息后，项目经理准备了额外测试。

这是执行什么类型的风险应对策略？

A、接受

B、减轻

C、回避

D、转移

我的答案：B　参考答案：B

41、(6539)项目审计期间，项目经理与团队开会，并要求查看处理潜在技术故障的文件。项目经理需要的是下列哪一份文件？

A、龙卷风图

B、甘特图

C、风险登记册

D、质量管理计划

我的答案：C　参考答案：C

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

42、(6540)项目干系人要求项目经理分布报告间接成本和直接成本。以下哪一项属于直接成本？

A、电话服务成本

B、项目需要的岗位培训

C、陪审员义务支付

D、员工工资

我的答案：D　参考答案：D

43、(6541)在执行一个项目期间，成本绩效指数（CPI）为0.80，进度绩效指数（SPI）为0.70 。此时，项目发起人希望了解按预算完成项目范围的难度有多大。
下列哪一项工具或技术对项目经理有帮助？

A、完工预算（BAC）

B、成本预测

C、完工估算（EAC）

D、完工尚需绩效指数（TCPI）

我的答案：D　参考答案：D

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

44、(6542)最近在一个新产品中发现缺陷数量上升，高级管理层非常担心，并要求项目团队调查这个问题。若要确定根本原因，项目团队应使用什么工具？

A、帕累托图

B、工作分解结构

C、直方图

D、石川图

我的答案：D　参考答案：D

45、(6543)项目团队收集所有项目干系人需求并定义项目范围后，项目团队下一步应做什么？

A、定义分配给项目资源的活动

B、核实项目范围，满足项目目标

C、制定与项目可交付成果一致的进度计划

D、将项目可交付成果分解为可管理的工作内容

我的答案：D　参考答案：D

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

46、(6544)一家公司引入一个新产品。项目团队将建造一个新网站来推广这个产品，这将能节省成本和进度，但是可能对质量有影响。

项目经理应该怎么做？

A、指示团队寻找另一个可选方案。

B、执行风险概率分析。

C、根据变更管理过程提出一项变更。

D、完成项目，因为更快且花费更少。

我的答案：B　参考答案：C

47、(6545)为改进进度计划，项目经理考虑将一些资源从较不关键活动调到关键活动上。由于单点活动持续时间估算未考虑到估算的不确定性，应使用哪一个公式来确定关键活动的近似范围？

A、正常分布

B、贝塔分布

C、三角分布

D、累积分布

我的答案：B　参考答案：B

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

48、(6546)为了做出关键性决策，项目经理反复要求几名关键干系人参加项目会议，但是他们没有参加。

项目经理下一步应该怎么做？

A、执行影响分析并通知项目发起人。

B、利用项目发起人遵循问题升级过程。

C、查阅沟通管理计划。

D、按照该关键干系人的时间调整项目管理计划。

我的答案：B　参考答案：C

49、(6547)一个施工项目遇到了获得许可的问题。因此，项目进度受到不利影响。
为了反映这个进度变更，项目经理应使用下列哪一项工具或技术？

A、调整时间提前量和滞后量

B、资源平衡

C、缺陷修复

D、PERT

我的答案：A　参考答案：A

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

50、(6548)一个为期两年的项目获得批准，并分包交付。在执行阶段期间，分包商的可交付成果与客户存在冲突。
项目经理下一步该怎么办？

A、与干系人开会

B、核实采购协议

C、核实范围文件

D、审查采购计划

我的答案：B　参考答案：B

51、(6549)项目经理根据发生概率以及对项目的潜在影响对项目风险排列优先顺序。项目经理在执行的是下列哪一项？

A、定量风险分析

B、定性风险分析

C、进度网络分析

D、计划风险分析

我的答案：B　参考答案：B

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

52、(6550)在与干系人一起召开的季度状态评审会上，由于计划外的运输罢工，施工公司的项目经理报告了一个负成本偏差。项目经理应该如何解决这个问题？

A、调整成本绩效基准

B、从应急储备中分配资金

C、从管理储备中分配资金

D、测量项目事件的影响

我的答案：B　参考答案：C

53、(6551)为工期紧张的并行项目工作的项目团队了解到其中一个项目将被取消，团队感到松了一口气，因为将不再需要加班了。

项目经理下一步应该怎么做？

A、与项目团队开会，说明情况，并收集经验教训

B、与项目团队开会，审查问题日志

C、立即解散项目团队，让他们能够专注于其他项目

D、承担项目取消的全部责任

我的答案：A　参考答案：A

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

54、(6552)在项目执行阶段，一名关键干系人表达了可能影响项目的问题。在干系人识别过程中项目团队制订了一份文件，其中概述了管理该关键干系人的策略。

项目团队制定的是下列哪一份文件？

A、干系人参与项目程度评估矩阵

B、风险登记册

C、干系人登记册

D、沟通管理计划

我的答案：C　参考答案：C

项目经理与项目干系人开会，报告项目状态。项目经理涉及的是哪一个过程？

A、控制沟通

B、沟通管理计划

C、管理沟通

D、管理干系人参与

我的答案：C　参考答案：C

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

56、(6554)公司的主管经理评估开始一个新产品线的可行性。该产品线的初始投资为10,000美元。预期现金流如下：

年 现金流入

1 3,000美元

2 5,000美元

3 7,000美元

根据所提供的数据，使用内部收益率技术，为保证这个项目可行，该公司将接受的最大资本成本为多少？

A、32%

B、10%

C、25%

D、15%

我的答案：C　参考答案：D

57、(6555)一名项目经理被任命管理一个正在进行当中的项目。新项目经理可以在下列哪一份文件中找到范围基准方面的信息？

A、项目管理计划

B、项目范围说明书

C、项目章程

D、项目需求

我的答案：A　参考答案：A

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

58、(6556)一个项目依靠一家外部供应商来执行一些项目任务。与该供应商的服务水平协议（SLA)含糊不清，且不允许对紧急问题采取快速转变。

项目经理首先应该怎么做？

A、要求项目发起人重新与供应商起草服务水平协议。

B、确定一名替代供应商避免这个风险。

C、向供应商宣布奖励和处罚，获得更好的周转时间。

D、将由于供应商的绩效导致的延期识别为风险登记册的一项风险。

我的答案：D　参考答案：D

59、(6557)项目发起人通知项目经理一个意外事件将对项目预算造成负面影响。项目经理下一步该怎么做？

A、不采取任何行动，因为该事件是意想不到的

B、与项目团队开会，准备并实施权变措施

C、指示项目团队实施风险登记册中计划的权变措施

D、使用应急储备实施权变措施

我的答案：B　参考答案：B

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

60、(6558)在被任命管理一个技术项目之后，项目经理注意到在风险登记册中有一长系列风险。为了有效管理这些风险，项目经理下一步应该创建什么？

A、风险概率评估与假设分析

B、风险概率与影响分析

C、根本原因分析

D、敏感性分析

我的答案：B　参考答案：B

61、(6559)项目经理被分配管理一个职能型组织里的地产开发项目。项目团队是按照专业知识从不同地方选择的。发现难以管理分处不同地方的项目团队成员，项目经理申请了一个新地点，将团队集合在一起。项目经理使用的是什么项目团队建设技术？

A、紧密矩阵

B、团队建设

C、形成

D、基本规则

我的答案：A　参考答案：A

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

62、(6560)项目提前结束，若要记录完成的工作量，项目经理下一步应该怎么办？

A、核实范围过程

B、执行项目收尾

C、开展实施后审查

D、合同收尾

我的答案：B　参考答案：B

63、(6561)公司的一项关键计划正在进行规划阶段。团队制定项目管理计划的基准，并且已经准备好执行项目。项目经理下一步该怎么做？

A、安排一次与关键干系人的会议，获得继续批准

B、在项目管理信息系统（PMIS）中设置项目基准

C、开始按照项目管理计划执行

D、审查这项关键计划的风险登记册

我的答案：A　参考答案：A

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

64、(6562)项目接近完工，但另需要$120,000美元来完成该项目。虽然该项目已经花费了$100万美元，出于各种情况，项目发起人要求项目经理终止该项目。

在这种情况下，实际成本为：

A、项目的直接成本

B、项目应急储备的一部分

C、项目的间接成本

D、该决定不考虑沉没成本

我的答案：D　参考答案：D

65、(6563)项目经理必须评估一位承包商在新的项目工期内交付设备的能力。之前使用同一个承包商完成了类似的项目。
哪一份文件识别了成功和失败之处，来帮助准备一份新合同？

A、采购绩效审查

B、经验教训

C、风险登记册

D、组织过程资产

我的答案：D　参考答案：B

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

66、(6564)在可交付成果验收之后，项目经理正在记录项目相关的经验教训。这时项目经理接到一名干系人的变更请求，请求其支持与其中一个项目主要可交付成果有关的事件。
项目经理应该怎么做？

A、向干系人澄清该事件必须提交给支持团队。

B、将该事件记录在问题日志中，并开始采取纠正措施。

C、向项目团队报告该事件，要求立即采取纠正措施。

D、将该事件记录在经验教训文档中。

我的答案：B　参考答案：D

67、(6565)项目已完成40%。若要提高团队生产力，改善流程的执行，项目经理应该开展下列哪一项？

A、头脑风暴会议

B、风险审计

C、过程优化评审

D、质量审计

我的答案：C　参考答案：D

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

68、(6566)在将可交付成果所有权转移给项目管理计划中定义的项目干系人之前，项目经理发现其中一个项目可交付成果未完成。在审查工作分解结构(WBS)词典理解工作描述后，干系人对谁该负责该交付成果意见不一致。为避免这种情况，应该事先审查什么？

A、范围基准

B、执行、负责、咨询和知情（RACI）矩阵

C、事业环境因素

D、工作分解结构（WBS）

我的答案：B　参考答案：B

69、(6567)在项目执行期间，公司被出售，干系人发生变化，一名新干系人询问项目如何与公司的业务需求保持一致。

项目经理应与干系人一起查阅下列哪一份文件？

A、项目管理计划

B、干系人管理计划

C、项目章程

D、需求文件

我的答案：C　参考答案：C

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

70、(6568)项目经理分配到大量资源。然而，该项目经理现在希望增加两名关键资源，而这两名资源因为之前被分配到组织中的另一个项目上，未被包含在初始资源池中。

项目经理应采用哪种工具或方法？

A、招募

B、协商（Negotiation）

C、预分配

D、虚拟团队模式

我的答案：B　参考答案：B

71、(6569)项目团队开发了新产品。项目经理正在努力识别干系人的明确需求，并担心可能影响执行阶段的问题。

应采取哪一个策略来尽可能减轻未来返工的风险？

A、德尔菲技术

B、标杆对照

C、原型制作

D、实验设计

我的答案：C　参考答案：C

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

72、(6570)一个最近实施项目的客户要求项目经理调查导致业务中断和损失的实施后问题。项目经理向客户解释该请求必须转给运营团队，因为项目已正式验收。客户不同意并投诉这种情况。

为结束讨论，项目经理应进行下列哪一项？

A、要求项目团队评估根本原因，纠正问题并记录经验教训

B、审查收尾文件，将其提交给客户，并让运营代表加入继续问题解决过程

C、将客户的投诉上报给项目发起人，分配资源解决该问题

D、审查风险管理计划，确定是否提前识别和规划该问题

我的答案：B　参考答案：B

73、(6571)在为一个跨国公司管理项目时，为保持良好的关系以及获得新业务，项目经理持续接受来自客户的变更。在项目进行三个季度后，预算耗尽。

若要防止这个问题，项目经理应制定哪一项？

A、项目范围说明

B、成本管理计划

C、工作说明书（SOW）

D、变更管理计划

我的答案：A　参考答案：D

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

74、(6572)

项目团队识别到一个紧急事件，要求立即进行变更。由于进度计划有限，没有足够的事件遵循标准的变更控制流程。

项目经理下一步该怎么做？

A、停止项目，直到变更获得变更控制委员会的批准为止

B、建立新的变更控制委员会来评估变更

C、通知项目发起人并询问意见

D、首先记录变更，并在之后获得变更控制委员会的批准

我的答案：A　参考答案：D

75、(6573)在执行一个大型项目中途，任命了一名新项目经理。新项目经理应使用下列哪一项来找到管理参与各方之间关系的相关信息？

A、沟通管理计划

B、组织过程资产

C、干系人管理计划

D、干系人登记册

我的答案：C　参考答案：C

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

76、(6574)规划项目时，项目经理预期在整个项目实施过程中，产品需求将频繁变更。项目经理希望减轻每个产品版本过程中丢失信息的风险。

为减轻这个风险，项目经理应在项目管理计划中包含哪一项？

A、运行图

B、因果图

C、变更管理计划

D、配置管理计划

我的答案：D　参考答案：D

77、(6575)项目经理计划聘用外部供应商，长期供应货物和服务。如要让公司和供应商避免未来的成本变化，应使用什么类型的合同？

A、总价加经济价格调整合同（FP-EPA）

B、固定总价合同（FFP）

C、工料合同（T&M）

D、总价加激励费用合同(FPIF

我的答案：A　参考答案：A

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

78、(6576)项目经理为高级管理层编制了一份绩效报告，其中预测了某个软件功能的下一次发布。这次发布将增加销售量，并将在八个月内回收整个项目支出成本。这个预测通过使用情景建设和模拟估算来支持。
这些属于下列哪一项实例？

A、参数估算

B、偏差分析

C、预测方法

D、预算预测

我的答案：D　参考答案：C

79、(6577)项目团队在其试验阶段交付一个系统，客户识别到影响最终用户的一个问题。在项目团队为这个问题工作一周后，客户通知项目经理的主管该问题未得到解决，并要求立即采取措施。
项目经理下一步应该怎么做？

A、审查项目登记册，并采取相应措施

B、审查实施整体变更控制过程，并采取相应措施

C、审查质量管理计划，并采取相应措施

D、审查沟通管理计划，并采取相应措施

我的答案：B　参考答案：B

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

80、(6578)
项目经理识别出可能对一个战略项目目标产生负面影响的多个问题。项目经理下一步该怎么办？

A、确保根据对项目目标的影响对每个问题赋予优先级

B、召开一次特别项目会议，将问题委派给团队成员

C、获得项目发起人的批准，变更项目目标

D、使用项目应急储备，分配额外的资源解决问题

我的答案：A　参考答案：A

81、(6579)一家医院希望实施一个病历系统，一家顾问公司的项目经理将制作项目章程。
项目经理需要下列哪一项来制作项目章程？

A、项目工作说明书和组织过程资产

B、项目工作说明书和过程改进计划

C、事业环境因素和质量管理计划

D、商业论证和风险管理计划

我的答案：A　参考答案：A

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

82、(6580)
在项目启动期间，下列哪一种方法将需要最长的执行时间？

A、自下而上

B、参数估算

C、量级估算

D、类比估算

我的答案：A　参考答案：A

83、(6581)一个项目由于质量和进度问题被取消了。此外，竞争对手刚发布了一个类似产品，项目经理被分配管理一个具有有固定期限要求的新项目。
项目经理应该怎么做，来确定不会再次发生同样的问题？

A、开展绩效审查，并应用纠正措施


B、使用之前项目最终报告中提供的信息

C、对工作分解结构应用滚动式规划

D、将主题专家分配到处于关键路径上的任务

我的答案：B　参考答案：B

84、(6582)

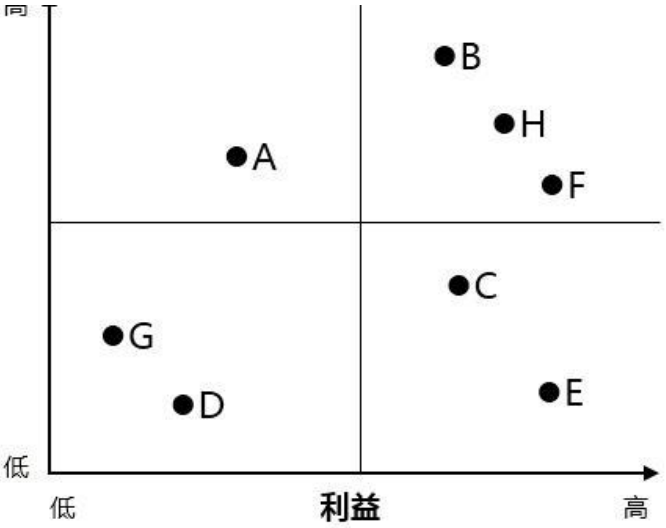

项目经理制定了一个干系人权力/利益方格。干系人A应该接受什么级别的参与度？

A、偶尔项目更新

B、执行高层次报告

C、定期面对面会议

D、每周详细状态报告

我的答案：B　参考答案：B

85、(6583)一家公司必须为他们的软件实施项目选择一个卖家。项目经理不能准确估算工作范围或成本。项目经理应该考虑哪种合同类型？

A、工料合同

B、固定总价合同

C、总价加激励费用合同

D、成本加固定费用合同

我的答案：A　参考答案：D

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

86、(6584)项目经理必须确定成本或时间的应急储备是否需要修改。哪项技术可以帮助项目经理做出这个决策？

A、专家判断

B、偏差和趋势分析

C、概率分布

D、风险评估

我的答案：B　参考答案：B

87、(6585)

项目发起人决定为项目增加一个功能，但影响项目成本、进度和范围。该变更已经获得变更控制委员会的批准。下列哪个过程可以管理项目经理实施批准的变更？

A、控制风险

B、控制成本和进度

C、指导和管理项目工作

D、实施整体变更控制

我的答案：C　参考答案：C

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

88、(6586)

完成项目规划之后，项目经理安排了一次阶段结束会议。在这次会议上，会发生什么情况？

A、项目经理审查项目团队成员的绩效

B、高级管理层分析项目经理的绩效

C、审查项目可交付成果，并做出绩效项目决定

D、记录项目的经验教训，项目收尾

我的答案：A　参考答案：D

项目经理在项目执行阶段离职后，项目发起人任命了一名新项目经理。新项目经理确定项目不能按时交付。
项目经理下一步应该怎么做？

A、对项目进度赶工。

B、更改项目完成日期。

C、执行定量风险风险分析。

D、更新风险登记册并通知发起人。

我的答案：A　参考答案：D

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

90、(6588)

在负责管理一个正在进行中的项目之后，项目经理确定支持项目的质量测量标准不足。项目经理下一步该怎么做？

A、创建直方图和帕累托图来记录结果，并与关键干系人分享

B、与项目发起人讨论项目状态并向项目团队更新

C、评估项目管理计划的质量差距，并更新质量管理计划

D、完成项目时更新经验教训，并建议过程改进

我的答案：C　参考答案：C

项目的可交付成果存在不一致性。应该使用什么工具来确保任务获得一致执行？

A、质量核对表

B、控制图

C、石川图

D、蒙特卡洛分析

我的答案：D　参考答案：A

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

92、(6590)在一个项目的执行阶段，客户希望让IT总监参与剩余可交付成果的批准过程。该名IT总监在项目中是一个重要角色，但是被识别为一个高层次/低利益同事。由于在项目开始时只收集到高利益干系人的需求，这危及剩余可交付成果的批准。
项目经理下一步应该怎么做？

A、更新风险登记册，并将此识别为可能导致延期的风险。

B、暂停项目执行，直至收集到该名IT总监的所有需求。

C、要求客户代表签发一项变更请求。

D、向客户解释在这个阶段提出变更的影响。

我的答案：A　参考答案：A

93、(6591)在完成一项任务之后，项目团队成员希望将他们实际所花费的时间与该任务的计划持续时间进行对比。为此，团队成员应参考工作分解结构（WBS)中的下列哪一项？

A、工作包

B、任务

C、控制账户

D、可交付成果

我的答案：C　参考答案：C

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

94、(6592)在项目规划期间，开展了多次需求收集和审查研讨会。由于项目的复杂性，要求多名业务干系人审查和批准需求。即使开展了审查，但还是忽略了其中一个受需求影响的业务流程。

项目经理应如何克服这个挑战？

A、引入技术简化审查过程

B、组织演练会议，将需求追溯到商业需求

C、改进需求评审会议的便利性

D、头脑风暴，让审查变得更有效率

我的答案：D　参考答案：B

95、(6593)

一名项目团队成员实施了一个能够减少项目成本并缩短工期的创意。项目经理下一步应该怎么做？

A、将该成就与项目团队分享，并公开认可该团队成员

B、为该团队成员提供所节约成本的一定百分比作为奖励

C、将该创意计入工作绩效信息中

D、在项目结束时私下庆祝该团队成员

我的答案：C　参考答案：C

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

96、(6594)一项调查显示执行一个项目的最低可能成本为$1亿美元。进一步调查之后发现有类似项目交付成果比估算多25%，而另一个项目成本比最低成本估算多三倍。

使用所有提供的估算，下列哪一项应作为成本估算？

A、$1亿美元

B、$1.5亿美元

C、$2亿美元

D、$2.5亿美元

我的答案：B　参考答案：B

97、(6595)一个施工项目的初始规划期间，识别到需要一个混凝土混合器。
-临时租赁设备的价格为200美元每天
-按租约租用设备的成本为100美元每天，初始付款为10,000美元。
至少要经过多少天，按租约租用会比临时租赁更经济？

A、91天
B、101天
C、151天
D、按租约租用不是一个可行的方案

我的答案：B　参考答案：B

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

98、(6596)新到组织的项目经理被分配管理一个具有多名干系人的项目。项目经理希望确定哪些干系人是内部的、哪些干系人是外部的。
若要了解干系人的角色，项目经理应该查阅哪一份文件？

A、干系人登记册
B、干系人风险
C、干系人管理计划
D、干系人沟通模型

我的答案：A　参考答案：A

99、(6597)审查估算期间，项目经理识别了可用于估算的历史数据，这是使用了哪一种估算方法？

A、自下而上估算
B、专家判断
C、三点估算法
D、类比估算

我的答案：D　参考答案：D

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

100、(6598)
项目经理被要求提交一份成本绩效报告。项目经理需要哪些输入来完成这项任务？

A、范围、时间和成本
B、成本、质量和风险
C、成本、范围和风险
D、进度、成本和质量

我的答案：C　参考答案：A

101、(6599)

公司管理层正在消减预算，因此必须做出如何消减某个关键、持续项目预算的决定。

项目经理首先应该怎么做？

A、提交能够减少成本的更新进度计划，并减少最终可交付成果的范围

B、解散某些分配的资源并延长项目时间线

C、减少管理储备以保持项目进行

D、使用敏感性分析评估不同风险

我的答案：D　参考答案：D

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

102、(6600)软件公司为其目前的计算机系统开发了一款新应用程序。在试验阶段审查期间，许多用户识别到应用程序的不同问题。技术经理收集和记录了这些投诉，确定将在哪里找到改进应用程序的最大机会。

技术经理使用什么来解释收集的数据？

A、亲和图

B、力场分析

C、帕累托图

D、核对表

我的答案：C　参考答案：C

103、(6601)创建一个团队执行一个项目。该项目已经过规划和设计，目前正处于执行当中。在项目中，项目经理的主管通知必须变更某个特定功能。

项目经理下一步应该怎么做？

A、与团队开会并计划实施该变更

B、与客户开会。说明该变更对项目的必要性

C、评估变更并分析影响

D、忽视该请求，因为该项目已经过规划和设计

我的答案：C　参考答案：C

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

104、(6602)为期三年的项目完成了60%，项目经理注意到最近的进度绩效指数（SPI)从0.94变成1.02。项目经理将这个原因归为缺乏对最近里程碑的重视。

项目经理下一步应该怎么做？

A、请求项目发起人与团队讨论满足期限要求的重要性

B、安排培训，增强团队成员实现进度目标的能力

C、定期召开团队会议确保团队重视下一个可交付成果

D、重新确认项目章程，并提供短期激励，重新激发进度绩效

我的答案：D　参考答案：C

105、(6603)一个过程的一系列输出测量值随时间记录下来，平均值为0.8，而标准差为0.2，而测量值分别为：0.72、0.91、0.85、1.45、0.64、0.65、0.86

下列哪一项描述了以上结果？

A、运行当中

B、在控制当中

C、失控

D、趋向

我的答案：C　参考答案：C

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

106、(6604)

在第一次团队会议期间，一名新任命的项目经理在讨论项目问题时发现了一些问题，项目经理从哪里获得有关团队建设的信息？

A、团队绩效评估

B、人力资源管理计划

C、问题日志

D、工作绩效报告

我的答案：A　参考答案：B

107、(6605)项目经理被分配管理一个具有快速变化环境的项目，需求范围难以提前定义。

下列哪一个项目生命周期模型应协助项目经理定义较小的增量改进，并为干系人提供最大价值？

A、迭代和增量型生命周期

B、适应型生命周期

C、预测型生命周期

D、阶段到阶段关系

我的答案：C　参考答案：B

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

108、(6606)项目经理完成一个软件项目的开发，比进度计划提前了一个月。这使得现在可以将一个原本超出范围的额外模块包含在内，并且项目仍然满足交付日期。

项目经理下一步应该怎么做？

A、进入收尾阶段，为组织节省资金

B、向变更控制委员会(CCB)提交一份变更请求

C、需要项目发起人的决定

D、交付额外模块

我的答案：A　参考答案：B

109、(6607)公司希望对其工作程序实施一项重大变更，并外包给供应商交付这项变更。项目经理和内部干系人制定了一份采购管理计划，分发了建议邀请书（RFP），不同供应商提交了答复。项目团队将两个供应商加入候选名单，但担心他们提出的成本超出项目的指导方针。
若要完成采购过程，项目经理应该怎么做？

A、要求项目发起人提供额外资金

B、选择第三方顾问评估项目，并提供成本估算

C、执行自制或外购分析，评估最佳方案

D、要求供应商协商价格，否则面临落选的风险

我的答案：C　参考答案：B

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

110、(6608)项目团队为客户准备了一份业务改进意见清单，项目经理使用投票过程为最有用的意见排列等级。这使用的是哪一个技术？

A、亲和图

B、头脑风暴

C、概念/思维导图

D、名义小组

我的答案：D　参考答案：D

111、(6609)
公司推出一个新项目，项目团队创建了项目范围说明书，应包含下列哪一项确保拥有简明扼要的范围？

A、工作分解结构（WBS）要求、目标和风险

B、可交付成果、假设和约束条件

C、干系人、需求和发起人

D、目标、时间线和预算

我的答案：B　参考答案：B

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

112、(6610)在安装新软件期间，项目经理发现执行一项特定功能所需的时间不被客户接受。项目经理收集了该功能时间的10个测量值，其中两个高于平均值，两个在平均值上，五个低于评价值，还有一个大于建议的限制。根据这些测量值，项目经理可以确定出与该功能相关的什么结果？

A、需要更改预期限值，以满足创建报价时所花的最多时间

B、处于空置当中，因为10个创建时间中有9个处于预期限值范围内

C、失控

D、平均值需要重新计算

我的答案：C　参考答案：C

113、(6611)买方和卖方签署了一份合同说明书。卖方按合同规定完成工作，然而，买方却对工作结果不满意。合同的状态是什么？

A、未完成

B、放弃

C、完成

D、无效

我的答案：A　参考答案：C

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

114、(6612)项目团队成员更新了项目任务状态，并发现项目落后于进度。项目经理应使用下列哪一项来评估状态更新对原始基准的影响？

A、工作绩效信息

B、资源平衡

C、PERT

D、假设情景分析

我的答案：D　参考答案：A

115、(6613)

在为一个软件开发项目执行质量保证活动时，项目团队发现新的用户应用程序与原始项目范围不相符，应使用什么工具来识别问题并制定纠正措施？

A、因果图

B、质量审计

C、龙卷风图

D、定量风险分析

我的答案：B　参考答案：B

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

116、(6614)

变更控制委员会（CCB）批准了几项项目变更，同时影响了进度和预算。需要下列哪一项？

A、纠正措施或缺陷补救

B、纠正或重定进度措施

C、缺陷修复或重新定义措施

D、强制或预防措施

我的答案：B　参考答案：A

审查团队成员的绩效情况后，项目经理发现缺少某些必要技能。为解决这种情况，项目经理应该怎么做？

A、创建一份培训计划，培养必要的技能

B、将问题上报给高级管理层

C、调整项目范围使之适应团队的技能集

D、在项目发起人的帮助下申请项目团队成员

我的答案：A　参考答案：A

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

118、(6616)一名新的CFO更改了公司战略，结果，各项计划都要重新排序。一个项目已经完成，但还未收尾。项目经理应向业务单位提交下列哪些文件？

A、项目管理计划和项目工作说明书（SOW）；历史信息

B、绩效记分卡；需求和可交付成果验收文件

C、可交付成果验收和项目收尾文件；项目档案

D、交付成果验收和项目后评估文件；绩效记分卡

我的答案：C　参考答案：C

119、(6617)

在项目执行期间，项目经确定团队的冲突行为导致一些里程碑未达到。为避免这种情况，项目经理应该事先做什么？

A、联系所有团队成员的职能主管，请求他们的干预

B、安排一次团队会议，对行为基本规则达成一致意见

C、发送一份函件，通知团队成员所期望的行为

D、在培训计划中包含有关问题解决技巧方面的软技能培训

我的答案：B　参考答案：B

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

120、(6618)

项目经理正在为一个开发更强材料的项目工作。若要确定哪种成分组织将以合理的成本生产出更强的材料，项目经理应该考虑哪一项？

A、品质圈

B、标杆对照

C、德尔菲技术

D、实验设计

我的答案：D　参考答案：D

121、(6619)一名新接触项目主题的项目经理正在估算完成项目活动所需的工作，但是无法以合理的自信度完成这些活动。

项目经理应该使用下列哪一项技术来完成估算？

A、自下而上估算

B、出版的估算数据

C、替代分析

D、专家判断

我的答案：A　参考答案：A

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

122、(6620)项目经理要求为两个潜在项目执行成本效益分析。

项目A成本为$12亿美元，潜在效益为$60亿美元，未来运营成本为$15亿美元。

项目B成本为$14亿美元，潜在效益为$70亿美元，未来运营成本为$10亿美元。

项目经理应该推荐哪一个项目？

A、项目B，其潜在效益减执行成本所得的值大于项目A所得值

B、项目A，其执行成本小于项目B

C、项目B，其潜在效益减执行成本及问了运营成本所得的值大于项目A所得值

D、项目A，其潜在收益加未来运营成本小于项目B所得值

我的答案：C　参考答案：C

123、(6621)

在每个阶段结束时，项目经理都执行了收尾过程。若要完成收尾过程，项目经理首先应该怎么做？

A、更新项目文档

B、答复干系人对下一个项目阶段的变更请求

C、评审上一个阶段的文档和结果

D、识别进度偏差为负数

我的答案：A　参考答案：A

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

124、(6622)项目发起人和项目经理正在为新的能源厂制定项目章程。有多个厂址可供考虑，但可能影响项目成本。

若要选择最合适的厂址，项目发起人和项目经理必须首先执行下列哪一项工作？

A、商业需求

B、项目范围说明书

C、商业论证

D、项目预算

我的答案：C　参考答案：C

125、(6623)一名深入了解下一个产品版本的关键资源从组织中辞职。项目经理了解到该名资源将加入竞争对手公司，非常担心竞争优势将受到威胁。
若要防止这个问题，项目经理应该事先做什么？

A、在确定项目范围期间聘用人力资源团队

B、审查干系人管理计划

C、在确定项目范围期间聘用法律和合规团队

D、将该名资源从项目中开除

我的答案：B　参考答案：B

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

126、(6624)担心与项目无关的邮件数量，一名团队成员认为其中一个可交付成果将延迟，因为时间都花在阅读和回复邮件上。项目经理应该怎么做？

A、要求团队成员加班完成工作

B、要项目团队更改项目沟通管理计划

C、与项目团队一起巩固时间管理计划

D、与团队成员一起巩固沟通管理计划

我的答案：D　参考答案：D

127、(6625)
一个平衡矩阵式组织的一个施工项目将需要一年时间完工。职能经理通知项目经理所有工程资源均已完全利用，在未来11个月都不能接受任何工作。

A、使用约束优化评估选择方案

B、执行进度压缩并修订预测

C、向项目发起人沟通更新的进度基准

D、评估延期影响并识别潜在选择方案

我的答案：D　参考答案：D

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

128、(6626)项目发起人要求项目经理细化项目估算。项目经理确定项目管理计划中某个具体活动需要细化，根据初始估算，最可能的活动持续时间为两天；但是最乐观情况为一天；最悲观情况为四天。
使用计划评审技术（PERT），项目经理应在项目管理计划中写入的活动持续时间是多少天？

A、2.33天

B、1.88天

C、2.17天

D、3.23天

我的答案：C　参考答案：C

129、(6627)项目团队完成了一个能支持300名用户的局域网站开发。该网站还未运营。一名关键成员将在网站移交运营之后无法为网站工作。

项目经理下一步应该怎么做？

A、更新风险管理计划

B、创建一份移交计划，包含一份有待解决问题的清单

C、为运营团队雇佣备用人员

D、在局域网站获得批准之后监视30天

我的答案：B　参考答案：B

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

130、(6628)本地供应商无法满足交付日期。项目团队没有预计到这个产品供应的新威胁。进口该产品将让项目成本比使用本地供应商的花费贵两倍。

项目经理应使用什么来为这项工作提供资金？

A、应急储备

B、项目预算储备

C、管理储备

D、风险应对储备

我的答案：C　参考答案：C

两名团队成员之间的人际冲突，团队士气和生产力受到不利影响。项目经理应使用什么冲突管理技术来立即解决冲突？

A、缓解/包容

B、撤退/回避

C、妥协/调解

D、强迫/命令

我的答案：D　参考答案：D

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

132、(6630)一个项目在接近完工时被取消了。在遣散项目团队之前，项目经理应确保解决下列哪一项？

A、完成绩效审查并向顾问付款

B、通知项目发起人，并更新项目管理计划和项目文件

C、执行经验教训和庆祝团队解散

D、保留中间阶段产品，并处理行政收尾

我的答案：D　参考答案：D

133、(6631)项目经理被任命管理一个处于另一个国家的项目。由于当地货币贬值，无法采购所需的项目材料。若要解决这个问题，必须处理下列哪一项计划？

A、采购管理计划

B、质量管理计划

C、成本管理计划

D、范围管理计划

我的答案：A　参考答案：A

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

134、(6632)

项目经理制定了一份完成项目活动所需的财务资源估算。由于信息不足，项目成本存在不确定性。哪一项技术能够协助项目经理记录、制定基准并与关键干系人沟通这种情况？

A、专家判断

B、资金限制平衡

C、质量成本

D、储备分析

我的答案：D　参考答案：D

135、(6633)在规划一个与之前已完成项目的范围类似的战略项目。当前的项目使用业务合作伙伴提供的经验丰富人员，项目经理必须决定如何准备成本估算。

项目经理首先应该做什么？

A、使用卖方投标分析

B、查阅采购管理计划

C、使用专家判断，以及组织知识库的支持

D、参考之前项目的经验教训

我的答案：C　参考答案：C

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

136、(6634)

有三个项目任务所需要的服务，公司无法提供。为解决这个问题，项目经理应该做什么？

A、查阅采购管理计划

B、发起项目变更请求，使用不同的服务


C、要求职能经理推荐供应商

D、按照可用资源更新项目进度

我的答案：A　参考答案：A

137、(6635)项目经理制作了一份图表来描述挣值管理（EVM）。图表中使用成本绩效指数（CPI）和进度绩效指数（SPI）来衡量指标。项目管理办公室（PMO）的指导方针规定，如任何项目成本或进度偏差超过10%，必须上报到项目管理办公室。

项目经理应上报什么内容？

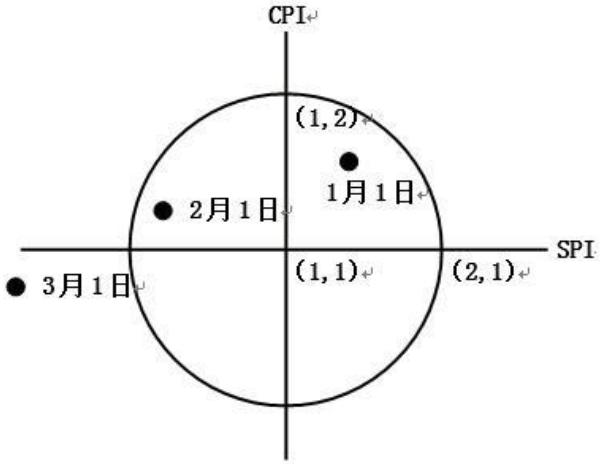

A、项目进度延迟且成本超支

B、项目只是成本超支

C、项目只是进度延迟

D、项目没有任何问题

我的答案：C　参考答案：A

138、(6636)在为一项已获批准的变更请求工作时，项目团队添加了一个不属于已批准变更请求的功能。项目经理认为这项功能将十分有益。

若要管理这个额外的变更，项目经理下一步应该怎么做？

A、提交一份新的变更请求用户批准

B、执行干系人分析

C、将额外功能记录作为原始变更请求的组成部分

D、咨询项目发起人

我的答案：A　参考答案：A

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

139、(6637)一家公司获得设计和制造一个项目部件的合同。该合同为总价加激励费用（FPIF）合同。

项目经理应使用什么分析技术来说明与成本绩效目标的偏差？

A、预测方法

B、储备分析

C、偏差分析

D、回归分析

我的答案：C　参考答案：C

140、(6638)

在执行一个价值百万美元的项目期间，项目团队遭遇到中间可交付成果高故障率。导致公司管理层十分担忧。项目经理应利用下列哪一项工具来识别这个问题的根本原因?

A、鱼骨图

B、直方图

C、散点图

D、流程图

我的答案：A 参考答案：A

项目经理完成三个月的工作，成本偏差为$-3000美元。挣值分析显示下列哪一项？

A、有利，项目的执行下列比计划高

B、不利，项目的执行下列比计划低

C、有利，项目提前于进度

D、不利，项目落后于进度

我的答案：B 参考答案：B

查看详情 补充题解 加入收藏 加入班级讨论

142、(6640)在根据进度基准审查项目的实际进度之后，项目经理注意到项目规划和进度软件预测的最早完成期是在目标完成日期后四周。似乎项目有了新的关键路径。然而，项目经理对这一信息没有把握，并认为项目仍处于控制当中。项目经理要求项目计划工程师审查项目。在修订了进度计划之后，目标完成日期也进行了调整。

若要纠正进度计划，项目经理应该事先做什么？

A、增加更多的资源，对关键路径上的任务赶工

B、正确更新项目进度计划，因为其未正常更新

C、检查并更正适用于关键路径活动的逻辑关系

D、删除进度计划中不再适用的任务

我的答案：C 参考答案：B

在审查一份测试计划后，项目经理确定预算不足以执行该计划。哪一项有助于平衡成本制约因素和质量目标？

A、风险登记册

B、鱼骨图

C、优先顺序矩阵

D、控制图

我的答案：C 参考答案：C

查看详情 补充题解 加入收藏 加入班级讨论

144、(6642)一个项目团队正在估算一个施工项目的成本。多名团队成员曾参与过类似项目，并提议通过在历史数据和其它变量之间建立一个统计关系来估算成本。但是，有些团队成员拒绝使用这个方法，因为项目地点不同。

若要避免估算过程出现偏差，项目经理应该做什么？

A、评估与成本有关的假设条件

B、与专家召开一次会议来统一技术

C、使用更为详细的方法

D、接受团队大多数成员的建议

我的答案：A 参考答案：A

145、(6643)一个项目最可能的工期为10周。最乐观的工期为6周，而最悲观的工期为12周。该项目经理希望用三角分布来估算活动工期。

那么预计的持续时间为几周？

A、9

B、9.33

C、10.5

D、12

我的答案：B　参考答案：B

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

146、(6644)一个项目拥有来自多个地区的资源，目前团队成员之间发生冲突。来自地区A的团队成员抱怨来自地区B的团队成员不满足约定的时间线，且没有以高效的方式提交项目风险。

若要解决这个问题，项目经理应该怎么做？

A、制定明确的基本规则

B、使用认可与奖励

C、开展文化意识培训

D、团队集中办公

我的答案：A　参考答案：A

147、(6645)

项目工期（月）	8.00	
完工预算（BAC）	20，000 美元	
已完成工作实际成本（ACWP）	8,000 美元	实际成本（AC）
已完成工作预算成本（BCWP）	7,500 美元	挣值(EV)
计划工作预算成本（BCWS）	8,500 美元	计划价值（PV）

这个数据表明了什么项目进展速度？

A、预算和进度都提前于目标

B、到目前为止完成的工作都符合目标

C、有必要进行预算修订，让预测保持一致

D、到目前为止完成的工作比计划慢

我的答案：D　参考答案：D

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

148、(6646)

项目经理已经获得项目发起人对项目的承诺和验收（acceptance），这属于下列哪一项的输出？

A、项目管理计划

B、商业论证

C、干系人管理计划

D、项目章程

我的答案：D　参考答案：D

149、(6647)项目经理被任命管理一个更换过时系统的项目。在安装期间，设备损坏，并要求技术资源修理。必须更新哪一份文件将这种情况与干系人沟通？

A、问题日志

B、状态报告

C、事件管理计划

D、资源分配矩阵

我的答案：A　参考答案：A

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

150、(6648)在一个弱矩阵型组织中，项目经理经历了与同时也是项目团队成员的职能经理共事合作方面的困难。该团队成员负责的项目任务没有按照进度计划完成，这个问题已经在不止一个场合中与该团队成员讨论过，但仍无任何改进。

项目经理下一步该怎么办？

A、将问题上报给人力资源部门解决

B、与项目发起人沟通这个问题，并请求解决支持

C、安排一次团队会议，讨论状态和选择方案

D、更新风险登记册和问题日志

我的答案：D　参考答案：B

项目中途，项目经理意识到没有足够的时间来完成所有可交付成果。项目经理下一步该怎么做？

A、评估导致当前情况的问题

B、向客户提供项目可交付成果的替代方案

C、项目客户提交因果分析（Present a cause and effect analysis to the customer）

D、安排一次与客户的会议

我的答案：A　参考答案：A

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

152、(6650)

项目接近方案的其中一部分估算成本为75000美元，可以外包给一名分包商。在做出外包决定之前，应执行哪种分析类型？

A、挣得的货币价值

B、自制或外购分析

C、专家判断

D、建议书评价技术

我的答案：B　参考答案：B

153、(6651)一家公司对由一个供应商所交付的产品进行最终检查，项目经理了解到在供应商更换缺陷零部件之前，该项可交付成果的所有权将不会转移到公司。
为确保该项可交付成果的最终验收，项目经理下一步该怎么做？

A、确定缺陷零件是否可修补
B、开展核实范围过程
C、审查干系人管理计划
D、审查质量控制测量

我的答案：D　参考答案：B

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

154、(6652)一个团队正努力在两周内实现下一个可交付成果的截止日期。 项目经理了解到为了实现这个目标，必须立即做出一项决定
项目经理应该利用下列哪一项？

A、管理储备和快速跟进
B、预算储备和赶工
C、管理储备和赶工
D、预算储备和快速跟进

我的答案：B　参考答案：B

155、(6653)项目经理计算项目的进度绩效指数（SPI）为0.95，成本绩效指数（CPI）为1.04 。下列哪一项说明了项目状态?

A、落后于进度，但低于预算
B、提前与进度，但超出预算
C、落后于进度，并超出预算
D、提前于进度，并低于预算

我的答案：A　参考答案：A

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

156、(6654)
项目经理使用样品偏差测量来监视不同时间的制造过程结果。项目经理应使用下列哪一个质量工具？

A、散点图
B、直方图
C、帕累托图
D、统计抽样

我的答案：D　参考答案：D

在创建概率和影响矩阵来支持项目风险分析时，项目团队认为最重要的是什么？

A、项目范围和项目可交付成果

B、进度和预算储备和管理储备

C、可能对项目目标的影响

D、将在项目中发生的内在联系

我的答案：B　参考答案：C

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

158、(6656)项目经理估算一个新项目的工期为10个月。一个类似项目曾延期 10%。根据风险分析，项目将延期五个月

那么新项目工期的真实估算是多少？

A、12.5个月

B、11个月

C、11.5个月

D、13.5个月

我的答案：C　参考答案：C

项目经理要求人力资源部门组织一次团队协作会议来建设项目团队。这一过程的预期输出将是下列哪一项？

A、人力资源管理计划

B、项目成功

C、社交风格简介

D、团队绩效评价

我的答案：D　参考答案：D

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

160、(6658)公司的项目A目前符合进度并在预算之内。但是总经理希望抓住新的业务机会，要求启动项目B。为了按时交付项目B，项目A的大部分资源必须转移到项目B。

项目经理下一步该怎么做？

A、通知总经理项目A已经有项目章程强制要求并具有优先级

B、与指导委员会的负责人讨论对项目A的影响，并请求做出决定

C、在拥有最小团队规模的情况下继续项目A的工作，并开始项目B

D、与项目发起人联系并讨论该情况

我的答案：B　参考答案：A

161、(6659)在实施一个施工项目中途，供应商未能交付水泥。这危及项目的进度计划。施工团队的领导请求项目经理实施应急计划。

项目经理应该采取什么措施？

A、通知项目干系人发生该风险

B、实施权变措施

C、查阅风险登记册

D、与团队头脑风暴

我的答案：C　参考答案：C

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

162、(6660)一名项目经理必须分配公司资源，包含关键职能主题专家（SME）。但是，公司领导不愿意释放一些资源。

项目经理下一步应该怎么做？

A、更新沟通管理计划

B、更新干系人登记册

C、使用干系人分析

D、使用人际关系技能提供这些资源

我的答案：D　参考答案：D

一个项目接近交付日期，项目经理希望确保满足前三个质量措施， 应使用哪一项工具或技术？

A、优先顺序矩阵

B、亲和图

C、决策树图

D、过程决策程序图（PDPC）

我的答案：A　参考答案：A

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

164、(6662)买方和卖方签订一份成本加成百分比合同。根据项目定义的范围，合同的估算成本为140,000美元，并约定利润为成本的10%。然而，项目并未成果，项目的实际成本为150,000美元。那么给卖方的补偿总额是多少？

A、165,000美元

B、150,000美元

C、154,000美元

D、140,000美元

我的答案：A　参考答案：A

项目经理召开一次项目过程内部评审会，目的是为了减少问题，提高效率，项目经理应该关注什么方面？

A、在过程运行期间所识别的增值活动

B、正在实施的最佳实践

C、在过程运行期间所经历的约束条件

D、差距和不足

我的答案：A　参考答案：A

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

166、(6664)项目经理担心客户误解项目的复杂性，导致做出不准确的决策。在项目状态会议上，邀请客户工程经理。项目经理意识到新的工程经理对项目有深入了解。

项目经理接下来应执行下列哪一项？

A、要求项目发起人将该工程经理指定为项目焦点。

B、开始向工程经理发送工作绩效信息

C、将该工程经理登记为一名项目干系人

D、影响该工程经理支持项目

我的答案：C　参考答案：C

167、(6665)项目团队完成项目的可交付成果。为促进项目收尾，可交付成果的所有权应转移给下列哪一项？

A、项目管理办公室（PMO）

B、被任命的项目干系人

C、组织过程资产

D、项目发起人

我的答案：D　参考答案：D

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

168、(6666)一个新的行业标准影响了项目执行。项目经理与项目发起人讨论影响。

这代表了哪种影响类型？

A、组织过程

B、变更管理

C、风险管理

D、事业环境因素

我的答案：D　参考答案：D

169、(6667)一个项目的预算成本为200，000美元。在每周评审会议上，项目经理确认：
截至目前的预算支出：82，000美元
截至目前的实际支出：85，000美元
截至目前的挣值（EV）：75，000美元
项目的成本偏差（CV）是多少？

A、低于预算3，000美元
B、高于预算3，000美元
C、高于预算7，000美元
D、高于预算10，000美元

我的答案：D 参考答案：D

查看详情 补充题解 加入收藏 加入班级讨论

170、(6668)在一个项目的生产设施中发生了一个自然灾害，使得生产线停工一星期。项目经理收到生产设施停机的通知。
应该首先更新哪一项？

A、风险登记册
B、项目管理计划
C、工作分解结构（WBS）
D、问题日志

我的答案：A 参考答案：A

171、(6669)在项目施工阶段，项目发起人决定对内部设计进行重大修改。项目经理首先应该审查哪一项？

A、范围基准
B、范围管理计划
C、变更管理计划
D、配置管理计划

我的答案：A 参考答案：C

查看详情 补充题解 加入收藏 加入班级讨论

172、(6670)一家公司开发一个采用多个外部采购部件的新通讯产品，并将与以互联网有序相结合。这项计划预计将扩大公司的市场份额和客户群.
项目经理应使用什么技术来开展关键产品部件的采购？

A、广告、投标人会议和采购谈判
B、建议书评价、标杆对照和协商解决
C、采购谈判、检查和审计以及专家判断
D、供方选择标准，因特网搜索和独立估算

我的答案：A 参考答案：A

一个项目将按时按预算收尾。下列哪一项资源将确认项目满足完工条件？

A、技术主管和项目经理

B、客户和项目组合经理

C、项目经理和业务主管

D、项目经理和项目发起人

我的答案：D　参考答案：D

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

174、(6672)项目发起人要求项目经理细化项目估算。项目经理确定项目某个具体活动需要细化。根据初始估算，最可能的活动持续时间为两天；但是最乐观情况为一天；最悲观情况为四天。

使用计划评审技术（PERT），项目经理应在项目管理计划中的持续时间是多少天？

A、2.33天

B、1.88天

C、2.17天

D、3.23天

我的答案：C　参考答案：C

175、(6673)一个价值150,000美元的项目要求完成以下任务：

任务1今天开始，且估算持续时间为2天；

任务2要在任务1结束后才能开始，且估算持续时间为8 天；

任务3要在任务1结束后才能开始，且估算持续时间为4 天；

任务4要在任务2结束后才能开始，且估算持续时间为8 天；

任务5要在任务4结束后才能开始，且估算持续时间为1 天；

关键路径的持续时间是多少？

A、15天

B、17天

C、19天

D、23天

我的答案：C　参考答案：C

176、(6674)采购部门向潜在供应商提交一份执行一个项目的建议邀请书（RFP），投标人会议后，项目经理收到供应商A要求澄清RFP的电子邮件。

项目经理下一步该怎么做？

A、修订RFP，增加澄清意见，并将其重新发送给所有供应商

B、向所有供应商发送具有澄清意见的电子邮件

C、向供应商A发送具有澄清意见的电子邮件

D、发送信息之前获得管理层的批准

我的答案：A　参考答案：A

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

177、(6675)

在实施后评估期间，客户总监表示对项目团队所交付的质量不满意。另外，客户担心预算超支。项目经理应该做什么来改进客户对下一个项目的满意度？

A、与项目团队开会，审查并修订项目管理计划

B、加强预算和质量的监控活动

C、增加状态会议的频率

D、与已收尾项目的干系人和项目团队开会收集经验教训

我的答案：D　参考答案：D

一个项目接近完工时，客户发现一个重大系统故障。项目经理必须评估这一故障对项目的影响。这描述的是哪一项技术？

A、质量成本（COQ）

B、成本效益分析

C、质量管理方法

D、标杆对照

我的答案：A　参考答案：A

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

179、(6677)

一名干系人联系项目经理询问为什么项目团队进度中签发了一项变更。项目经理认为之前已与该干系人讨论变更，但是干系人回忆不起对话

若要在将来避免这个问题，项目经理应该采取什么不同措施？

A、召开焦点小组会议

B、创建一份变更日志

C、选择不同的媒体

D、执行推进技术

我的答案：B　参考答案：B

180、(6678)一家公司启动一个高风险项目，并获得之前发送给所有供应商的建议邀请书。供应商指出他们能够以15，000美元完成所定义的工作范围。
供应商应与该公司签署什么类型的合同？

A、总价加激励费用合同（FPIF）
B、成本加激励费用合同（CPIF）
C、固定总价合同（FFP）
D、成本加固定费用合同（CPFF）

我的答案：C　参考答案：B

181、(6679)在项目期间，团队成员经历工期延期。由于团队正在努力弥补损失的时间，产品质量将会受到负面影响。
为避免在项目生命周期后期质量成本超支，项目经理应该怎么做？

A、质量保证计划
B、质量管理计划
C、质量控制图
D、质量审计

我的答案：D　参考答案：D

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

182、(6680)
项目经理为一个处于最早阶段的项目召开会议。正在等待项目干系人的批准。项目经理应使用什么来影响干系人？

A、项目发起人的策略
B、选择的卖方清单和竞争分析
C、清晰表达观点和立场，积极倾听并了解
D、准确的工作分解结构（WBS）、可交付成果

我的答案：C　参考答案：C

183、(6681)公司的高级管理层团队决定利用数字社交网络，提高客户关系。该项目被董事会确定并列为最高优先事项。
项目经理将在哪个过程组被赋予职权，将组织资源应用到随后的项目活动？

A、启动过程组
B、规划过程组
C、执行过程组
D、监控过程组

我的答案：A　参考答案：A

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

184、(6682)一个项目正处于实施阶段中途，并在不同国家具有多个供应商。其中一名关键供应商与项目发起人具有长期关系。该供应商曾有延误交付日期的历史记录，但是报价十分具有竞争力。如果该供应商未能满足交付日期，则多个项目将会延期。
项目经理应使用什么策略？

A、将问题上报给项目发起人
B、与其他供应商协商
C、接受风险
D、使用自制或外购分析

我的答案：D　参考答案：B

在一个施工项目上，一名工会代表抱怨为其中一些资源安排的工作。若要解决这种情况，项目经理应该怎么做？

A、与工会代表一起修订范围管理计划来解决这个冲突

B、利用干系人参与项目管理

C、联系人力资源部门获得指导意见

D、事不关己问题，并对替代决定排列优先顺序

我的答案：B　参考答案：B

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

186、(6684)

项目经理注意到在风险登记册中记录的风险未被减轻。若要管理这个风险，项目经理需要从下列哪一项获得额外资金？

A、预算储备

B、未分配的项目预算

C、应急储备

D、管理储备

我的答案：C　参考答案：C

在项目早期阶段，项目经理意识到项目预算取决于原材料的价格。项目经理下一步该怎么做？

A、更新范围说明书

B、在价格上涨之前采购原材料

C、更新风险登记册

D、要求变更请求

我的答案：C　参考答案：C

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

188、(6686)项目已启动，发生重大变更，导致进一步更为详细的项目管理计划。

这个过程称作什么？

A、定义范围

B、项目控制

C、滚动式规划

D、项目变更管理

我的答案：D　参考答案：C

189、(6687)项目团队拥有从各个研讨会、焦点小组和头脑风暴会议收集的大量数据。他们很高兴能利用这些数据为项目创建一个创新产品。
项目团队如何才能确保范围与产品需求挂钩？

A、制作一份背景图作为参考

B、制作原型进行业务批准

C、制定产品需求基准

D、起草一份需求跟踪矩阵

我的答案：D　参考答案：D

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

190、(6688)在一个施工项目中途，外包施工工人因为工资方面的纠纷罢工。这将影响项目进度。
项目经理应使用下列哪一项来评估

A、假设情景分析

B、参数估算

C、卖方投标分析

D、类比估算

我的答案：A　参考答案：A

191、(6689)一名新项目发起人接管一个处于执行阶段的项目。项目发起人要求项目经理停止批准项目资源时间表。相反，发起人将该任务分配给另一名团队成员。
若要重新确立控制权，项目经理下一步应该做什么？

A、组织与项发起人召开会议，确定新的批准流程

B、遵循新项目发起人的指示，将任务委托给团队成员

C、让项目发起人参考人力资源管理计划

D、让项目发起人参考项目章程中提供的职权

我的答案：D　参考答案：D

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

192、(6690)在项目启动期间，项目经理A意识到该项目与其他项目互相依存、息息相关。项目经理A尝试更改这些相关的其他项目的计划，但其他项目的项目经理认为项目经理A超越界限。
项目经理A需要重新查阅哪一份文件？

A、范围管理计划

B、工作说明书（SOW）

C、组织过程资产

D、项目章程

我的答案：D　参考答案：D

193、(6691)一家公司开始一个新的系统项目，改进订单处理时间，简化供应链操作，并满足客户不断变化的需求以及紧张的进度。该公司任命一名项目经理，项目经理开始制定项目章程。

项目经理应在项目章程中包含哪些内容？

A、项目可交付成果和总体里程碑进度计划

B、干系人参与项目程度评估矩阵

C、项目用户验收标准和资金需求

D、项目边界、制约因素和假设条件

我的答案：D　参考答案：D

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

194、(6692)

与项目团队一起合作制作一份网络图的时候，项目经理注意到一系列活动能够并列执行，且必须按特定顺序完成。这需要哪一种活动排序方法？

A、操作绘图法

B、紧前关系绘图法

C、关键路径法

D、箭头绘图法

我的答案：B　参考答案：B

195、(6693)在一个项目开始后六个月，聘用了一名新项目经理。一开始，团队成员不尊重项目经理的指示，缺席定期会议，且不提供状态更新。然而，随着时间的过去，项目经理通过证明其专业知识和积极的态度，获得团队成员的支持。

项目经理所证明的是下列哪一项特性？

A、威望权力

B、处罚权力

C、权威权力

D、专家权力

我的答案：D　参考答案：D

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

196、(6694)公司启动了一个信息技术服务器开发项目。在风险评估期间，项目团队识别到硬件小组没有足够的资源按时完成其中一项可交付成果。为了按进度完成可交付成果，项目经理计划使用某个供应商的服务。

项目经理计划使用哪种风险应对策略？

A、转移

B、规避

C、开拓

D、减轻

我的答案：A　参考答案：A

197、(6695)项目发起人通知项目经理更换表现良好的团队成员。项目经理下一步该怎么做？

A、与发起人讨论重新考虑这个请求，因为团队成员表现良好，对项目成功有价值

B、只有对项目有利，才接受项目发起人的请求

C、接受项目发起人的请求，并使用合格资源更换团队成员

D、忽视项目发起人的请求，因为项目经理负责该资源

我的答案：A　参考答案：A

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

198、(6696)

高级管理团队、项目发起人和项目经理在计划完工日期之前六个月终止一个项目。项目经理下一步该怎么做？

A、审查问题日志并尝试结束所有悬而未决的问题，如有的话

B、制定程序调查并记录活动的原因（reason of the action）

C、用经验教训和历史信息更新知识库

D、解散团队成员，让其为其他项目工作

我的答案：B　参考答案：B

在制定项目管理计划时，项目经理与技术和管理人员讨论将需要哪些资源和技能水平来满足项目需求。项目经理应该使用哪一项来制定项目管理计划？

A、项目章程

B、专家判断

C、头脑风暴

D、德尔菲技术

我的答案：B　参考答案：B

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

200、(6698)

项目经理邀请一名有经验的工程师出现项目启动大会，讨论记录的历史限制和制约因素。项目经理使用的是下列哪一项组织资产？

A、主题专家

B、事业环境因素

C、经验教训

D、专家判断

我的答案：D　参考答案：C
