1、(6062)一家组织的战略是拓展新兴市场。项目发起人正在准备一次为管理层台开的演示会。演示内容包括项目的社会经济附加值及其对拟议地区生态影响的相关信息。
拓展建议书应包括哪些内容？

A、项目设计、施工和实施的风险分析和风险应对策略
B、详细的成本分解和应急需求
C、市场渗透、盈利能力和投资回报率的机会
D、详细的工作范围和项目实施时间表

我的答案：C　参考答案：C

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

2、(6063)项目经理被任命管理一个新项目，必须制定一份预算。项目经理请求一位曾从事过类似项目的项目经理提供协助。
项目经理使用的是哪种工具或技术？

A、参数估算
B、储备分析
C、对比估算
D、专家判断

我的答案：C　参考答案：D

3、(6064)项目经理邀请客户参加月会，但客户不常参加。项目经理应该怎么做？

A、继续邀请客户
B、更新风险登记册
C、将该问题上报给项目发起人
D、审查并更新沟通管理计划

我的答案：D　参考答案：D

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

4、(6065)在为一个战略项目招募资源时，项目经理发现一个关键资源将不能执行项目任务。假设该任务的计划不处于关键路径上，应使用什么战略来减轻这个问题？

A、尝试减少项目范围 为项目分配一个技能略差的资源，并增加任务持续时间
B、获得在周末工作的许可
C、延长项目结束日期并在项目后期解决该问题
D、为项目分配一个技能略差的资源，并增加任务持续时间

我的答案：D　参考答案：D

5、(6066)在项目启动阶段识别到的一个风险在执行阶段发生了，影响很大，可能导致项目环境的重大变更。

项目经理应该怎么做？

A、在变更日志中创建一项新变更，执行影响分析，并准备一份项目状态报告

B、更新风险登记册，创建并持续监控问题日志当中的问题

C、在问题日志中创建一项新问题，并立即通知干系人

D、更新风险登记册，并在变更日志中创建一项新变更，包含风险登记册中的详情

我的答案：D　参考答案：D

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

6、(6067)项目经理正在从事一个保留客户业务的项目。质量团队测量质量，确定了项目未能满足需求和技能规范的一些方面。

项目质量团队应用的是下列哪一个过程？

A、实施质量保证

B、控制质量

C、统计和偏差分析

D、计划质量管理

我的答案：B　参考答案：B

7、(6068)在准备项目A的人力资源管理计划时，项目经理发现IT总监需要一名特定资源。由于需要该资 源的日期未知，未将该资源包含在进度计划中。日期确定之后，项目经理得知该资源已被分配到项目B工作六个月，没有其他可用资源了，项目A必须在六个月内完成，但是项目B的发起人 拒绝接受任何可能延迟他们项目的风险。

项目经理A下一步应该怎么做？

A、向指导委员会建议取消项目A

B、建议指导委员会召开一次由两个项目的发起人参加的会议

C、建议培训项目A的团队成员获得必要技能

D、D. 建议IT总监招募一名后备资源

我的答案：C　参考答案：B

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

8、(6069)

项目经理正在审查供应商的变更请求，修改进入泵送设施的管径。这属于什么类型的变更？

A、范围

B、采购

C、质量

D、成本

我的答案：A　参考答案：B

9、(6070)公司A与公司B签订合同，执行项目工作。完成工作后，发现产品有问题，公司A拒绝向公司B 支付费用。若要解决这个纠纷，应该怎么做？

A、执行采购审查
B、使用一种替代纠纷解决方案
C、开始诉讼
D、检查并审计产品

我的答案：D　参考答案：B

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

10、(6071)采购新设备并升级现有装置的采购订单已提交。在延期一个月后，要求供应商提交状态报告。供应商答复说，由于库存短缺，还将延迟两个月才能交付。这将对项目进度计划造成不利影响。项目经理应该怎么做？

A、通知干系人，并提交变更请求
B、确认合同条款和条件
C、取消当前采购订单，并选择新供应商
D、更改采购管理计划包含这个延期

我的答案：A　参考答案：B

11、(6072)为了迎合节假日购物季，营销部门决定比原计划提前发布一个产品。基于这个目的，项目经 理为关键任务聘用两个额外的资源。
项目经理使用的是什么技术？

A、资源平滑
B、快速跟进
C、赶工
D、资源平衡

我的答案：C　参考答案：C

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

12、(6073)
项目经理正在实施一项对公司经营至关重要的新软件应用程序。在风险分析期间，由于项目 所在地能源供应商问题，一名团队成员识别到一个高发生概率的电气故障风险。这可能影响服务器，让应用程序不可用。项目发起人同意建立一个备用辅助站点。这使用的是什么风险应对策略？

A、转移
B、接受
C、回避
D、减轻

我的答案：D　参考答案：D

13、(6074)由于市场情况，一家公司经历人员变更。项目经理认为人员变更将项目影响项目资源。为减轻对项目资源的影响，项目经理应该怎么做？

A、识别潜在的替换人员

B、交叉培训团队成员

C、向项目发起人报告人员变更情况

D、在团队会议上解决这个问题

我的答案：A　参考答案：B

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

14、(6075)项目经理考虑一个项目是否需要外部资源。下列哪一项对创建采购管理计划有用？

A、供方选择标准

B、自制或外购分析

C、采购工作说明书

D、风险登记册

我的答案：B　参考答案：B

15、(6076)在项目开始，项目经理发现项目团队成员关键干系人对项目范围和可交付成果的意见不一致。为了取得项目团队的承诺和同意，项目经理接下来应该怎么做？

A、发送项目范围和一致同意的可交付成果给所有干系人

B、将该问题报告给高级管理层并寻求他们的支持

C、将该问题记录在问题日志中并继续项目的执行

D、和干系人和团队成员一起召开启动大会

我的答案：D　参考答案：D

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

16、(6077)在项目执行期间，项目经理收到客户组织中不同部门提交的两项变更请求。在与项目团队分析了变更请求后，项目经理得出结论，执行第一项变更将影响到第二项变更的执行。
项目经理下一步应该怎么做？

A、同时发起两项变更请求，并在执行阶段解决不兼容问题

B、与项目发起人和两个部门的代表开会，确定优先顺序

C、与项目团队和项目发起人开会，确定优先顺序

D、与项目团队和两个部门代表开会，确定优先顺序

我的答案：D　参考答案：B

17、(6078)在制定风险管理计划时，项目经理应如何识别风险？

A、制定基本规则
B、审查项目文件
C、评估风险登记册
D、审查概率和影响矩阵

我的答案：B　参考答案：B

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

18、(6079)供应商提交最终可交付成果的关键部件，并请求合同收尾。项目经理应该怎么做？

A、收尾合同
B、使用邮件
C、核实部件
D、请求干系人批准

我的答案：A　参考答案：C

19、(6080)项目经理召开一次紧急团队会议，审查交付时由客户发现的最终产品问题。审查所有测试结果后，确定需求收集过程定义不清，且未能加以遵循。
项目团队应该怎么做来改进未来的需求收集过程？

A、创建控制图
B、执行产品测试
C、实施质量保证
D、遵循沟通管理计划

我的答案：C　参考答案：C

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

20、(6081)针对实施一项可交付成果的最佳方式，两名项目团队成员进行争论。两名团队成员对满 足功能要求提出了不同方法，他们确定最好的方法就是要理解客户需要这个产品的原因。
下列哪一份文件能够帮助他们确定这一点？

A、ROI投资回报率分析
B、功能要求文件
C、工作分解结构
D、项目章程

我的答案：D　参考答案：D

21、(6082)客户验收测试即将结束，但是客户要求在提供批准之前进行一项变更，项目经理应该怎么做？

A、应用核实范围过程

B、通知项目发起人

C、进行变更，并获得批准

D、通过实施整体变更控制过程将该请求添加进范围当中

我的答案：D　参考答案：D

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

22、(6083)在执行下一个项目任务之前，必须完成多项风险的减轻工作。项目团队成员向项目经理确认风险减轻已完成，且该工作可以在下一个任务开始。
项目经理下一步应该怎么做？

A、更新带有风险结果的风险登记册，并评估剩余风险

B、更新项目风险减轻活动产生的经验教训

C、关闭风险登记册中的风险，并释放相关储备

D、批准下一任务的工作，并评估残余风险

我的答案：A　参考答案：A

23、(6084)一名项目团队成员超出其职权，导致其他团队成员之间的困惑。项目经理意识到如果之前更好地定义角色和责任，就可能避免这个困惑。
若要更好地定义角色和责任，应改造哪一份文件？

A、沟通管理计划

B、干系人管理计划

C、人力资源管理计划

D、工作分解结构（WBS）

我的答案：C　参考答案：C

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

24、(6085)项目经理刚刚被任命管理一个正在进行中的项目，了解到许多批准的变更请求还未解决，项目经理应该遵循下列哪一个流程？

A、核实范围

B、控制沟通

C、指导与管理项目工作

D、实施整体变更控制

我的答案：D　参考答案：C

25、(6086)项目发起人通知项目经理，由于一个不可预见的外部风险，从下个月开始，项目资金将 不可用。项目经理应该怎么做？

A、与项目发起人一起重新评估风险矩阵

B、请求额外资金减轻风险

C、建议推迟项目，直至风险减轻

D、收尾项目，并解散资源

我的答案：A　参考答案：D

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

26、(6087)项目经理面前有四个商业论证情景：
A需要投资1000万美元；净现值（NPV)为1200万美元 B需要投资1000万美元；ROI为1.2 C需要投资1000万美元；内部收益率（IRR)为1.2D需要投资1000万美元；利润为200万美元。
项目经理应该推荐哪一个商业论证？

A、A

B、B

C、C

D、D

我的答案：A　参考答案：A

27、(6088)项目范围已经历不断增长，这对进度和成本造成负面影响。若要尽可能减少这些影响，项目经理最好应事先完成哪一项？

A、制定变更管理计划

B、请求项目发起人批准

C、改进沟通

D、评估项目需求，制定项目可交付成果

我的答案：A　参考答案：A

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

28、(6089)在完成项目的前几个阶段后，项目经理将可交付成果交付给客户。客户请求对已验收的部分可交付成果进行变更。如果将这些变更结合进未来阶段中，将导致进度延期。
项目经理应该怎么做？

A、通过添加资源调整进度计划，反映客户的变更请求

B、变更任务之间的依赖关系，允许两个任务重叠

C、请求客户使用项目的变更控制过程提出变更请求

D、使用管理储备创建一项任务

我的答案：C　参考答案：C

29、(6090)当地社区领导表达开始一个施工项目的担忧，这可能会导致项目延期。项目经理想要分析并记录已识别关键项目关系人的想法。项目经理应该使用下列哪一项？

A、权利/利益方格

B、沟通管理计划

C、干系人参与评估矩阵

D、干系人登记册

我的答案：D　参考答案：D

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

30、(6091)在项目的测试阶段，识别到产品的多个问题。客户要求项目经理快速隔离受这些问题影响的特性。项目经理可以从哪里找到这个信息？

A、测试计划定义

B、工作分解结构（WBS)字典

C、需求跟踪矩阵

D、客户需求

我的答案：C　参考答案：C

31、(6092)变更请求已经获得变更控制委员会（CCB)的批准。项目经理下一步应该怎么做?

A、执行变更

B、更新项目管理计划

C、更新项目基准

D、通知项目发起人

我的答案：C　参考答案：B

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

32、(6093)项目经理需要两名关键主题专家（SME)对项目关键任务的建议。这两名主题专家在为过往项 目工作时曾有意见不一致的经历。项目经理应该怎么做？

A、创建认可与奖励计划

B、使用冲突管理技术

C、审查企业知识库

D、为新主题专家签发变更请求

我的答案：B　参考答案：B

33、(6094)由于必要的资源不可用，项目经理无法执行项目。项目经理担忧项目临结束，却未完成 可交付成果。
项目经理应该怎么做？

A、审查风险登记册
B、更新工作分解结构（WBS）
C、更新项目管理计划
D、上报给项目干系人

我的答案：A　参考答案：A

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

34、(6095)一个交付产品原型的项目按计划进行。但是实际成本超出了估算成本。项目经理必须确定质量是否是稳定的和可预测的。项目经理应该使用下列哪种技术？

A、力场分析
B、控制图
C、头脑风暴
D、流程图

我的答案：B　参考答案：B

35、(6096)在项目规划期间，项目经理识别到项目存在大量干系人。项目经理让一名团队成员根据每名干系人的潜在影响或支持来为每名干系人分类，然后才能更新沟通管理计划满足期望
应使用什么来进行分类？

A、资源评估
B、权力 /利益方格
C、资源直方图
D、干系人分析

我的答案：D　参考答案：D

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

36、(6097)什么系统属于项目管理信息系统（PMIS)的组成部分？

A、配置管理
B、沟通管理
C、变更管理
D、合同变更控制

我的答案：A　参考答案：A

37、(6098)负责开发一个两阶段产品的项目经理决定由不同的供应商完成每个阶段。高级管理层已确定第二阶段不得在第一阶段之前完成。
若要防止执行问题，项目经理应该做什么？

A、更新风险管理计划

B、与供应商开会

C、与高级管理层讨论

D、更新采购计划

我的答案：B　参考答案：D

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

38、(6099)在项目执行阶段，新项目经理接管项目，且所有项目文件均已交接。新项目经理确认已经使用了 50%的预算，成本绩效指数（CPI)为1.05,进度绩效指数（SPI)为0.75。 新项目经理下一步该怎么做?

A、A. 签发变更请求

B、B. 更新变更管理计划

C、C. 赶工或快速跟进项目

D、D. 审查范围管理计划

我的答案：C　参考答案：C

39、(6100)由于个人原因，一名项目团队成员通知项目经理将不能工作两周时间。该团队成员是能够执行一项关键路径任务的唯一资源。
项目经理应首先更新哪一份文件？

A、A. 工作分解结构

B、B. 风险登记册

C、C. 人力资源管理计划

D、D. 项目进度计划

我的答案：B　参考答案：B

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

40、(6101)在为活动项目管理计划批准的会议上，项目经理得知一名干系人已被替换，项目经理应将该信息记录在哪里？

A、A. 风险登记册

B、B. 干系人登记册

C、C. 人力资源管理计划

D、D. 干系人管理计划

我的答案：B　参考答案：B

41、(6102)一家公司决定实施一个新的供应链系统，该系统预计将让企业利润提高15%。财务部门担心其工作量增加，强烈反对该项目。
项目经理应该怎么做？

A、A. 管理干系人的期望
B、B. 解决冲突，让干系人满意
C、C. 协商会惠互利
D、D. 更新风险管理计划

我的答案：C　参考答案：A

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

42、(6103)在项目执行期间，一名团队成员经常抱怨说没有及时提供某些信息。项目经理应怎么做？

A、检查该团队成员绩效历史记录
B、与所有团队成员定期召开情况通报会
C、与该团队成员召开一对一的会议
D、审查沟通管理计划

我的答案：D　参考答案：D

43、(6104)项目经理正在努力识别一个大型项目的完整范围。项目经理应该审查什么？

A、项目进度计划
B、工作分解结构（WBS)和排列活动顺序
C、网络图
D、项目章程和需求文档

我的答案：D　参考答案：D

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

44、(6105)职能经理需要知道分配给某个项目的某些资源何时可以分配到其它任务上。项目经理应该向职能经理提供什么文件？

A、人员解散计划
B、资源日历
C、责任分配矩阵（RAM)
D、人员招募计划

我的答案：B　参考答案：A

45、(6106)批准项目范围和技术规范之后，客户请求对一些小的可交付成果进行改动以提升最终产品的价值。项目经理下一步应该怎么做？

A、拒绝变更，除非客户同意增加项目预算
B、评估该变更的影响，并提出一个变更请求
C、要求项目团队确认这些变更是否很小，并且，如果是，则实施
D、实施这些变更以加强与客户的关系

我的答案：B　参考答案：B

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

46、(6107)在漫长的延期后，生产线重新启动。若要核实产品是否仍然满足要求的技术规范，项目经理应使用什么工具和技术？

A、因果图
B、实验设计
C、专家判断
D、检查

我的答案：D　参考答案：D

47、(6108)为了在不断变化的环境中生存下来，公司必须制定项目管理文化。过去，该组织的愿景由供应部门驱动。然而，作为关键项目干系人的供应部门副总裁却拒绝采用新文化。
如何能够获得对这种新文化的一致认可？

A、邀请供应部门副总裁参加项目会议
B、与供应部门副总裁谈话，确定问题的根本原因
C、给供应部门副总裁开辅导课
D、让管理层安排一次所有项目干系人参与的战略会议

我的答案：B　参考答案：B

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

48、(6109)项目经理正在领导一支团队开发新的在线银行应用程序。23个月后，团队在开发方面已支出 100,000美元，剩余预算成本只有70,000美元，目标完成日期还有12个月，但是团队预期在九个月 内就能完成。一名团队成员发现一款成熟的现货产品满足所有项目规范，能够以60,000美元的价格 购买到，且能够在八个月内实施。
项目经理应该考虑什么？

A、完工尚需绩效指数（TCPI）
B、客户或项目发起人验收
C、开发方面已支出的金额
D、自制或外购分析

我的答案：D　参考答案：D

49、(6110)项目经理刚刚被任命管理项目A，了解到由于人力资源不足，项目落后于进度。经济制约因素 阻碍了公司招募新员工。但是，项目经理发现项目B即将完工。
确保项目A按进度计划交付，项目经理应该怎么做？

A、等到项目B完工，然后分配资源给项目A
B、协商并影响需要的资源
C、要求项目B的团队成员为项目A工作
D、要求项目A的团队成员加班工作

我的答案：B　参考答案：B

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

50、(6111)一家公司作为一个由政府发起的基础设施项目执行组织。最近选举后，所有正在进行的政府发起的基础设施项目均被搁置审查。
项目经理应该更新哪份文件？

A、范围管理计划
B、问题日志
C、风险登记册
D、项目进度计划

我的答案：C　参考答案：C

51、(6112)项目经理收到一个新项目的已批准项目章程。项目经理安排了一次会议，与销售总监、人力资 源经理以及其他关键团队成员一起，检查并确认可能受到项目影响的每个人的角色、职责和期望。
这个会议将产生什么结果？

A、干系人沟通渠道
B、干系人分析矩阵
C、干系人分类
D、干系人登记册

我的答案：D　参考答案：D

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

52、(6113)项目经理接管了一个苦苦挣扎的项目，了解到团队对前任项目经理与他们的互动方式感到失望，团队对前任项目经理在没有团队参与的情况下做出关键决策感到担忧。
哪种激励理论描述的是前任项目经理？

A、Y理论
B、马斯洛需求层次理论
C、激励-保健理论
D、X理论

我的答案：D　参考答案：D

53、(6114)一名工程师正在从事一个设施升级项目。在项目可交付成果目的说明会上，承包商询问了多个工程师无法回答的问题。会议结束后，工程师让承包商根据他们自己对可交付成果的理解提交建议 书。若要获得更为明确的可交付成果愿景，项目经理应事先完成哪一项？

A、工作分解结构（WBS）
B、项目管理计划
C、项目范围
D、项目章程

我的答案：A　参考答案：C

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

54、(6115)一名干系人抱怨说未收到项目延期交付的通知。若要防止这个问题，项目经理应事先做什么？

A、更新需求跟踪矩阵
B、审查沟通管理计划
C、审查风险管理计划
D、更新干系人登记册

我的答案：B　参考答案：B

55、(6116)项目经理希望执行预测，确定项目是否满足其成本和进度目标。哪个来源将提供创建这项预测的信息？

A、工作绩效信息
B、工作绩效报告
C、工作绩效数据
D、工作绩效基准

我的答案：B　参考答案：C

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

56、(6117)供应商通知项目经理无法满足一项需求。项目经理应查阅哪一份文件来确定如何处理此供应商提出的变更请求？

A、变更管理计划
B、项目管理计划
C、工作说明书（SOW）
D、采购协议

我的答案：A　参考答案：D

57、(6118)由于洪泛平原沿线发生自然灾害的频率增加，仓库主任希望启动一个项目，审查和更新灾难管理计划。项目经理应该使用下列哪一项来识别项目风险？

A、风险概率和影响矩阵
B、头脑风暴
C、风险评级和排序
D、流程图

我的答案：B　参考答案：B

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

58、(6119)新软件必须在一个确切的、不可协商的日期制造完成，且不能变更范围和成本。项目前期阶段的部分可交付成果已经延迟。
在制造软件之前，项目经理应使用什么来制定测试阶段的进度计划？

A、赶工
B、快速跟进
C、风险控制
D、质量控制

我的答案：B　参考答案：B

59、(6120)一名项目资源错过分配任务的期限，该资源抱怨说起主管分配了额外任务。
项目经理应该怎么做？

A、向该资源提出书面警告
B、聘用额外的资源
C、与该资源及其主管一起分析情况
D、与项目管理办公室（PMO）一起确定项目优先次序

我的答案：C　参考答案：C

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

60、(6121)公司决定外包其技术支持中心。在一个概念项目验证后，许多用户抱怨沟通不畅，因此公司中止此项目并外包支持中心。
这项决定的驱动因素是什么？

A、验收测试
B、产品审查
C、阈值值控制界限
D、客户反馈

我的答案：D　参考答案：D

61、(6122)在项目规划阶段，项目A的项目经理了解到某项活动需要使用特殊设备。而采购安装该设备是项目B项目经理的责任。
哪种依赖关系类型反映了这项活动和所需设备之间的关系？

A、选择性内部依赖关系
B、选择性外部依赖关系
C、强制性内部依赖关系
D、强制性外部依赖关系

我的答案：C　参考答案：D

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

62、(6123)在一个设备升级项目期间，项目经理要求供应商每周提供进度报告。该供应商提出只要提交一份最终报告即可。
若要核实这一点，应该查阅哪一份文件？

A、执行、负责、咨询和知情（RACI)矩阵
B、工作分解结构
C、沟通管理计划
D、协议

我的答案：C　参考答案：D

63、(6124)项目经理与两名关键干系人开会，这两名干系人都识别到产生严重项目风险的事件。但是目前只有限的资源可用，项目经理应该怎么做？

A、制定风险排序表
B、执行定性风险分析
C、执行定量风险分析
D、更新风险管理计划

我的答案：B　参考答案：B

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

64、(6125)项目经理最近替换了一个全球多文化项目最近聘用的项目经理。在分析项目可交付成果的延期之后，项目经理决定调查隐藏的问题。
项目经理下一步应该怎么做？

A、重新制定项目团队规则以及认可与奖励
B、取消绩效差的资源并与所有项目团队成员重新确认承诺
C、识别项目团队成员的技能并根据个人技能重新分配任务
D、对所有项目团队成员执行一个项目绩效评估

我的答案：D　参考答案：D

65、(6126)承包商请求一项变更，但该变更将影响客户的项目和商业目标。变更通知单要求立即批准，以防项目停工。
项目经理应该怎么做？

A、与承包商协商，尽可能减少影响
B、由于其紧急性，批准变更
C、中止工作，直到探索到其它可选方案
D、请求项目发起人批准

我的答案：A　参考答案：A

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

66、(6127)在一次头脑风暴会议期间，项目团队制定了一系列应对策略，以减轻在新办公楼调试阶段电源故障的影响。选择最佳战略时，项目经理应考虑什么？

A、最低成本
B、易于实施
C、成本效益
D、能够提供快速结果

我的答案：C　参考答案：C

67、(6128)一名新项目经理负责管理一个正在进行中的项目，其中50%的项目团队成员均是外聘，项目经理发现外包团队成员交付的生产文档与公司标准不符。
项目经理应该怎么做？

A、审查人力资源管理计划，教育这些资源遵守公司标准
B、遵循采购文件中描述的行为
C、开展绩效评估，然后开始终止过程
D、将工作重新分配给熟悉工标准的团队成员

我的答案：A　参考答案：A

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

68、(6129)在项目进度审查期间，项目经理注意到活动最晚日期偏差超出接受的阈值。项目经理向项目业 主提交了一项变更请求，增加完成时间。
项目经理应执行什么分析来支持这项请求？

A、挣值管理(EVM)
B、趋势
C、储备
D、基准

我的答案：B　参考答案：B

69、(6130)接近其第一个关键里程碑时，进度计划受到制约。在讨论一个次要技术问题时，项目经理发现 两名团队成员之间的紧张情绪。
项目经理应使用下列哪一种冲突解决策略？

A、头脑风暴
B、缓解/包容
C、撤退/回避
D、合作/问题解决

我的答案：D　参考答案：C

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

70、(6131)项目经理最近将一名难对付的团队成员从项目中开除，但仍未能提振团队士气。项目经理下一步应怎么做？

A、奖励表现卓越的个人
B、与团队成员召开一次紧急会议
C、暂时解除不自觉的团队成员
D、奖励团绩效

我的答案：A　参考答案：A

71、(6132)一个项目施工阶段预期要持续24个月。项目发起人委员会担心存在通货膨胀对项目估算利润的影响，考虑中止该项目。
项目经理应该怎么做？

A、要求项目发起人委员会决定是否继续该项目
B、对潜在承包商进行资格预审，并将结论汇报给项目发起人委员会
C、开始招标过程，确定详细的成本，并将结论汇报给项目发起人委员会
D、执行敏感性分析，并将结论提交给项目发起人委员会

我的答案：D　参考答案：D

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

72、(6133)下列哪一项属于一个项目的最终任务？

A、完成经验教训审查和更新
B、将验收的可交付成果移交给客户
C、项目文件存档
D、解散项目团队

我的答案：D　参考答案：D

73、(6134)项目团队报告同行审查过程有非增值活动。质量团队必须审查这个发现，并处理全部遵守情况。质量团队正在执行的是下列哪一项？

A、质量遵守（quality adherence）
B、质量审计
C、质量控制
D、质量保证

我的答案：D　参考答案：D

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

74、(6135)项目经理将最终产品移交给客户，并解散项目团队。客户后来联系项目经理，要求添加一个新功能。
项目经理应该怎么做？

A、创建变更请求
B、召回项目团队成员
C、建议客户启动一个新项目
D、通知项目指导委员会

我的答案：C　参考答案：C

75、(6136)在一个虚拟组织中，应事先完成下列哪一项来管理规划阶段的项目信息流？

A、制定结构化的沟通管理计划
B、制定正式的沟通渠道
C、组建一支在相同时区工作的人员团队
D、审查过往虚拟项目的经验教训

我的答案：A　参考答案：A

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

76、(6137)项目团队由多名团队成员组成，一些成员积极参与项目，而另一些成员却比较消极。若要获得识别风险的最佳结果，项目经理应该使用哪一项工具或技术？

A、专家判断
B、德尔菲技术
C、三点估算法
D、调查

我的答案：B　参考答案：B

77、(6138)一名团队成员不遵守任务交付时间，过去三次项目状态会议都迟到，这影响了项目的关键路径。
项目经理应该怎么做？

A、与该团队成员私下谈谈
B、将该团队成员从关键路径任务上移除
C、在下一次项目状态会议上解决该问题
D、忽视该问题

我的答案：A　参考答案：A

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

78、(6139)若要了解新项目的需求，项目经理首先应查阅什么？

A、商业论证
B、工作说明书（SOW）
C、协议
D、组织过程资产

我的答案：B　参考答案：B

79、(6140)一项关键活动的专用、专业资源要求从下个月开始在家里工作，项目要求该团队成员未来三个月在现场工作。
项目经理应该怎么做？

A、向管理层要求替换
B、与团队成员的经理讨论该问题
C、分析该团队成员不在现场工作的影响
D、立即与团队成员讨论该问题

我的答案：C　参考答案：C

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

80、(6141)项目经理将与三名社区成员和三名内部客户沟通。项目将由多少个沟通渠道？

A、10
B、15
C、21
D、36

我的答案：C　参考答案：C

81、(6142)项目经理正在制定项目的质量管理计划。在确定项目的质量成本（COQ)时，项目经理应考虑下列哪一项？

A、培训，检查，奖励和业务流失

B、奖励，检查，返工和业务流失

C、培训，奖励，返工和业务流失

D、培训，检查，返工和业务流失

我的答案：D　参考答案：D

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

82、(6143)项目落后于进度两周时间，将会影响产品投入市场的风险越来越高，团队士气也很低。项目经理接下来应该怎么办？

A、提醒项目团队项目的重要性，并要求团队加班工作

B、将这个情况报告给项目发起人，增加额外的资源满足预期项目期限

C、与团队成员协商，确定一种改进工作组织的方式来压缩进度

D、将该情况与关键干系人和项目发起人沟通，并审查新结束日期

我的答案：C　参考答案：C

83、(6144)项目经理通过将工作包分解到活动中去，识别并记录产生项目可交付成果的具体活动。这将输出哪一份文件？

A、资源分解结构（RBS)

B、活动资源需求

C、里程碑清单

D、活动持续时间估算

我的答案：C　参考答案：C

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

84、(6145)项目章程已批准。接洽干系人时，项目经理发现项目章程包含不完整的信息。谁应该负责为项目经理澄清详细情况？

A、项目章程制定者

B、项目群经理

C、项目启动者或发起人

D、项目管理办公室

我的答案：C　参考答案：C

85、(6146)一家公司有一个必须在六个月内完成的固定预算项目。项目经理发现项目中存在一个事先未计划的延期，且资源只可用四个月。项目经理担心将不满足进度计划要求，并导致罚款。
项目经理下一步应该怎么做？

A、根据延期情况重新协商进度计划
B、书面记录风险，并上报发起人
C、获得关键资源对减轻延期的同意
D、通过快速跟进对进度计划赶工

我的答案：D　参考答案：D

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

86、(6147)在项目实施期间的周会上，项目经理向项目群经理提交一份更新后的部门资源开支报告。下列哪一项可以帮助项目经理获得这个信息？

A、责任分配矩阵（RAM）
B、组织分解结构（OBS）
C、工作分解结构（WBS）
D、D. 资源分解结构（RBS）

我的答案：B　参考答案：D

87、(6148)在项目结束时，项目经理发现已批准的范围中遗漏了多项法规要求，因此导致未解决。项目经理下一步应该怎么做？

A、提出一项变更请求，解决这些要求
B、指示团队成员在项目收尾之前进行变更
C、开始一个新项目，将这些要求作为范围
D、使用管理储备来解决这些要求

我的答案：A　参考答案：C

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

88、(6149)项目经理正在规划一个新的多公司参与项目，每家公司都有多名项目干系人。项目经理应该使用什么沟通方法？

A、交互式沟通
B、推式沟通
C、拉式沟通
D、选择（Selective）

我的答案：C　参考答案：A

89、(6150)一名新项目经理接管一个正在进行当中的多阶段项目。项目经理应使用哪些输入来识别项目风 险和假设条件？

A、项目成本、项目进度计划和项目文件
B、项目章程、组织过程资产和事业环境因素
C、成本管理、进度管理和质量管理计划
D、风险登记册、干系人登记册和专家判断

我的答案：B　参考答案：C

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

90、(6151)一家公司正着手打造一个创新产品，以解决一个已识别到的商业机会。一名高级经理尝试确定 在实施过程中可能面临哪些风险。该高级经理就工厂产能是否足够询问工厂经理，然后与财务副总裁(VP)讨论可用预算以及之前类似项目的财务绩效。
项目经理执行的是下列哪一项？

A、确定主要干系人的职位，制定影响作用方格
B、收集信息制定风险管理计划
C、应用专家判断，制定工作分解结构（WBS)和进度计划
D、收集信息制定项目章程

我的答案：B　参考答案：D

91、(6152)项目经理正在规划一个大型采购活动，希望在提交建议书之前与所有潜在供应商沟通。项目经理应使用什么工具或技术？

A、投标人会议
B、卖方投标分析
C、自制或外购决策
D、采购审计

我的答案：A　参考答案：A

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

92、(6153)一家公司的软件解决方案合同授予卖方。实施之后，该公司的用户发现了一些该公司支持团队必须解决的问题。包含在采购合同中的支持协议关键条款不明确，且偏向于卖方
项目经理应关注下列哪一个过程来避免这项冲突？

A、制定采购管理计划
B、实施采购
C、管理采购
D、控制采购

我的答案：B　参考答案：B

93、(6154)项目工期为八个月。根据表格，完成项目的新工期为多少？

项目工期（月）	8.00	
完工预算（BAC）	20,000美元	
已完成工作实际成本(ACWP)	8,000美元	实际成本（AC）
已完成工作预算成本(BCWP)	7,500美元	挣值（EV）
计划进度的预算成本(BCWS)	8,500美元	计划值（PV）

A、1个月
B、8.6个月
C、9.1个月
D、12个月

我的答案：B　参考答案：C

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

94、(6155)
项目经理发现一个新风险，可能影响项目进度计划。项目经理首先应该做什么？

A、创建减轻和应急计划
B、确定风险的概率和影响
C、安排一次团队会议
D、确定如何监督风险

我的答案：B　参考答案：B

95、(6156)一家施工公司承包了当地政府的一个桥梁建设项目。项目经理完成了工作分解结构（WBS），现在必须估算预算。
项目经理使用的是什么工具或技术？

A、成本汇总
B、储备分析
C、资金限制平衡
D、历史关系

我的答案：A　参考答案：B

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

96、(6157)客户与其中一名项目团队成员存在问题，一旦问题得到解决，且客户批准决议，项目经理下一步应该怎么做？

A、审查沟通渠道数量
B、请求和该客户开会
C、更新问题日志
D、沟通该客户的沟通需求

我的答案：C　参考答案：C

97、(6158)公司的高级管理层将为即将到来的节假日引进一项新产品。顾问公司为四个可能产品制定了五 年期现金流统计表：产品A、B、C、D。
基于下表，项目经理应该建议开发哪个产品？

产品名称	第一年末净现值（NPV）	第五年末净现值（NPV）
A	-4,000美元	12,000美元
B	-2,000美元	8,000美元
C	-2,200美元	12,000美元
D	-2,800美元	9,000美元

A、A产品
B、B产品
C、C产品
D、D产品

我的答案：C　参考答案：C

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

98、(6159)公司A中标，要在公司B部署一个新的企业资源规划（ERP)系统。完成项目的所有主要工作 后，公司B的生产经理指出ERP系统不能满足公司的要求。
项目经理应该审查什么？

A、建议要求书（RFP)
B、变更管理计划
C、工作说明书（SOW)
D、采购协议

我的答案：D　参考答案：D

99、(6160)由于组织变更，项目发起人要求缩短最终项目可交付成果的时间表。项目经理应该怎么做？
一名团队成员同志项目经理，一个已分配的任务不能通过常规方法实施。团队成员建议了一个新方法，但可能需要额外的时间，并影响项目基准。项目经理首先应该怎么做？

A、立即实施变更，满足进度基准
B、开始变更请求过程
C、与发起人开会，说明这种情况
D、执行变更影响分析

我的答案：D　参考答案：D

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

100、(6161)由于项目提前于进度计划，一部分项目预算变为可用。为了进一步增强项目绩效，项目经理下一步应该做什么？

A、将节省下来的资金分配给项目应急储备
B、任务提前于进度计划完成时奖励项目团队成员
C、将其作为成本节约活动报告给项目发起人
D、寻找机会，奖励和认可项目团队

我的答案：D　参考答案：D

101、(6162)一家公司与一个客户签订了多个项目的合同。完成第一个项目时，客户对可交付成果不满意，要求重新评价剩余项目。
项目经理应该怎么做来满足对未来可交付成果的期望？

A、审查质量管理计划
B、实施质量保证
C、实施变更请求
D、实施质量控制

我的答案：B　参考答案：B

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

102、(6163)由于项目经理辞职，一个处于执行阶段的项目已暂停三个月时间。任命新项目经理后，新项目经理首先应该做什么？

A、审查进度管理计划
B、审查项目管理计划
C、获得客户对需求和期望的反馈
D、查阅里程碑进度计划

我的答案：B　参考答案：C

103、(6164)项目经理被任命管理公司的一个技术项目。竞争对手正在使用不同的技术向市场投放相同的产品。结果，公司的项目发起人决定该项目不在有存在的必要性。
该公司的项目经理下一步该怎么做？

A、解散项目团队
B、终止项目
C、更新项目管理计划
D、与发起人讨论继续该项目的可行性

我的答案：B　参考答案：B

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

104、(6165)对一个实施项目的新软件进行测试时，两个部门认识到他们将需要调整操作程序。应使用哪一种工具或技术来完成这项工作？

A、控制图
B、德尔菲技术
C、石川图
D、过程流程图

我的答案：D　参考答案：D

105、(6166)可以使用哪一种工具或技术来控制风险？

A、储备分析、问题日志和风险审计

B、风险审计、储备分析和质量审计

C、头脑风暴、风险再评估和状态会议

D、风险审计、偏差分析和趋势分析以及储备分析

我的答案：D　参考答案：D

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

106、(6167)在项目执行期间，项目团队发现一个供应商的可交付成果重复出现缺陷。项目经理应该怎么做？

A、执行质量审计

B、与该供应商的高级管理层讨论该问题

C、审查采购协议

D、与供应商一起创建变更请求

我的答案：A　参考答案：A

107、(6168)在项目现场会议期间，项目经理通知公司约定范围存在偏差。在下一次会议前，公司仍未解决这个问题。

项目经理应该怎么做？

A、更新进度计划，显示正确的状态

B、更新工作绩效报告

C、确认沟通管理计划

D、将该问题重新分配给公司

我的答案：C　参考答案：C

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

108、(6169)公司最优秀的人才资源可用，并可在不影响预算的情况下减少项目持续时间。项目经理下一步应该怎么做？

A、将其记录为一项机会，并上报给项目干系人

B、直接聘用该资源为项目工作

C、创建变更请求

D、审查风险应对策略，并开拓机会

我的答案：D　参考答案：D

109、(6170)在与财务分析师准备商业论证时，需要以下哪一份关键文件？

A、成本效益分析

B、工作说明书

C、合同

D、项目章程

我的答案：B　参考答案：A

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

110、(6171)项目经理完成项目章程的制定，并与关键干系人一起审查项目章程。项目经理下一步应该怎么做？

A、制定项目管理计划

B、与项目团队一■起召开项目启动大会

C、获得项目发起人对项目章程的批准

D、获得干系人对项目章程的批准

我的答案：C　参考答案：C

111、(6172)项目发起人希望更新项目状态。项目经理应该使用下列哪种方法？

A、关键路径法

B、采购数据流分析

C、预期货币价值（EMV)分析

D、挣值管理（EVM)

我的答案：D　参考答案：D

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

112、(6173)项目经理向项目发起人告知一个与项目外部依赖有关的问题。一个项目合作伙伴需要升级其销售点系统，这在上线日期之前似乎不可能发生。虽然将发生额外成本，项目发起人决定继续向前推 进该项目。

这属于什么类型的应对？

A、预期货币价值(EMV)分析

B、第三方风险转移

C、货币建模与仿真分析

D、风险接受

我的答案：D　参考答案：D

113、(6174)定义并记录项目范围时，项目经理首先应查看哪一份文档？

A、项目章程
B、事业环境因素
C、功能需求
D、业务需求

我的答案：A　参考答案：A

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

114、(6175)由于对可交付成果不满意，项目经理提前终止了供应商的合同。项目经理必须基于下面哪一条来补偿供应商？

A、截至目前为止合同约定的挣值(EV)
B、与供应商约定的范围
C、合同约定的条款与条件
D、所有已验收的工作

我的答案：C　参考答案：C

115、(6176)如果一个项目的完工预算（BAC)为120,000美元，完工估算（EAC) 125,000美元，实际成本（AC)为105,000美元，那么项目的成本偏差（CV)是多少？

A、-10,000 美元
B、5,000 美元
C、15,000 美元
D、20,000 美元

我的答案：D　参考答案：B

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

116、(6177)项目经理正在主持一次状态会议，与承包商确认一项关键可交付成果的交付日期，必须起草一份同函件声明所有财务，法律和采购方面均已收尾。
这封函件将构成哪个过程的组成部分？

A、控制采购
B、结束采购
C、实施采购
D、结束项目或阶段

117、(6178)在项目执行期间，一次地震造成轻微损坏，但不会影响进度。项目经理下一步应该怎么做？

A、遵循风险应对计划

B、联系保险公司

C、请求项目发起人指示

D、停止项目并命令修复损坏

您的答案：A 参考答案：A

查看详情 补充题解 加入收藏 加入班级讨

118、(6179)若要定义工作分解结构（WBS)的工作包层次，项目团队应该做什么？

A、分析并识别所有项目可交付成果及其相关工作

B、组织和构建所有项目可交付成果

C、将项目活动分解成详细的组成部分

D、分析并识别所有项目活动的成本和持续时间

您的答案：A 参考答案：A

119、(6180)一个施工项目的两名团队常用对安装防护窗意见不一致。根据天气预报，预计24小时内项目所在地将有雷暴天气，如果安装未完成，整个项目将受到损害。

项目经理应使用哪种冲突解决技巧？

A、合作/解决问题

B、缓解/包容

C、妥协/调解

D、强迫/命令

您的答案：D 参考答案：D

查看详情 补充题解 加入收藏 加入班级讨论

120、(6181)创建工作分解结构（WBS)时，项目经理必须分解一项名为"招标"的任务。项目经理使用什么进一步细分任务？

A、石川图

B、关键链法（CCM)

C、专家判断

D、类比估算

您的答案：C 参考答案：C

121、(6182)审查项目状态时，项目经理发现团队成员在未向其告知的情况下接受客户变更，这导致额外的工作流程以及未记录的变更。
项目经理应该怎么做？

A、拒绝变更并实施原始范围
B、更改项目范围，包含这些变更
C、接受变更，并修订范围，进度计划和成本基准
D、审查情况，并执行实施整体变更控制过程

我的答案：D　参考答案：D

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

122、(6183) 项目经理收到一项请求，在新产品发布中包含一项安全功能。这项功能未包含在项目管理计划 或进度计划中，项目经理确定可以在不影响项目进度或预算的情况下实施这项功能。
项目经理下一步应该怎么做？

A、按照变更管理计划签发变更请求
B、要求安全分析员尽快实施该功能
C、拒接请求
D、更新项目管理计划和经验教训文件

我的答案：A　参考答案：A

123、(6184)项目经理估算一个新软件项目的成本。根据过往经验，公司制定了模块屏幕数量和生产一个模块所需的劳动小时数之间的统计关系。
应使用什么成本估算技术来利用这项信息？

A、类比估算
B、参数估算
C、自下而上估算
D、粗略量级估算

我的答案：B　参考答案：B

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

124、(6185)由于政府法规的变化，最终产品将需要增加个功能。在项目中已经讨论并批准增加功能的变更请求。这属于哪一种类型的变更请求？

A、纠正措施
B、工程设计
C、更新
D、缺陷修复

我的答案：D　参考答案：C

125、(6186)在项目实施期间，一名技术团队成员辞职。项目经理下一步应该怎么做？

A、提出一项正式的变更请求，并通知所有项目干系人

B、利用专家判断来确定影响

C、更新人力资源管理计划

D、更新进度管理计划

我的答案：B　参考答案：A

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

126、(6187)在项目期间，项目经理发现项目团队成员缺乏按进度计划完成任务的基本技能。下列哪一项计划能帮助项目经理解决这个问题？

A、需求管理

B、人员配备管理

C、沟通管理

D、进度管理

我的答案：B　参考答案：B

127、(6188)项目的工程设计经理基于标准输入制定了一份进度计划。项目发起人请求将某项活动的开始时间延迟一个季度，但这将影响资源可用性。
项目经理下一步应该怎么做？

A、重新定义项目活动

B、识别风险

C、制定进度计划

D、执行定量分析分析

我的答案：B　参考答案：B

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

128、(6189)项目经理收到一名团队成员提交的项目成本报告，然而，该报告未得到相关方的批准，看起来该团队成员未遵循记录和控制项目成本的程序和政策。 哪一个过程可用来确定这些政策和程序？

A、规划成本管理

B、控制成本

C、控制管理

D、制定预算

我的答案：A　参考答案：A

129、(6190)一项之前已定义并记录的风险在项目过程中触发。这项风险的已识别应对措施是与三个可能供应商的其中一个签订合同。
项目经理应该怎么做？

A、审查项目进度计划
B、检查供方选择标准
C、查阅风险登记册
D、使用专家判断

我的答案：C　参考答案：C

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

130、(6191)

项目日期（月）	8.00	
完工预算（BAC）	20, 000美元	
已完工作实际成本 (ACWP)	8,000美元	实际成本
已完工作预算成本（BCWP）	7,000美元	挣值（EV）
计划工作预算成本（BCWS）	8,500美元	计划价值（PV）

根据计算的完工估算(EAC),项目经理应该怎么做？

A、A. 由于存在成本超支的趋势，向下调整预算
B、B. 由于项目低于预算，重订进度计划基准
C、C. 由于有点成本超支的趋势，向上调整预算
D、D. 由于项目低于预算，采取行动加快活动

我的答案：A　参考答案：C

131、(6192)在项目启动阶段，项目发起人向项目经理询问已识别的风险情况。项目经理应参考下列哪一项？

A、项目章程
B、规划风险管理过程
C、风险登记册
D、控制风险过程

我的答案：A　参考答案：A

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

132、(6193)两名同事对一个项目交付的产品和服务意见不一致。若要解决这个分歧，项目经理应查看下列哪一份文件？

A、项目工作说明书（SOW）
B、人力资源管理计划
C、质量管理计划
D、项目管理计划

我的答案：D　参考答案：D

133、(6194)项目经理要求团队成员审查项目状态。团队成员通过测量、收集、分发绩效信息以及评估测量值可能趋势开始。项目经理正处于下列哪一个过程？

A、绩效评审

B、监控项目工作

C、执行整体变更控制

D、审计

我的答案：B　参考答案：B

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

134、(6195)项目经理被任命管理一个处于另一个国家的大型施工项目。在与项目团队的第一次会议期间，一名主题专家（SME)表达了自己对因突发的设备延期将导致项目不能按时完成的担忧。
项目经理应该首先审查哪一份文件来确定干系人对项目进度影响的容忍度？

A、项目进度计划

B、风险登记册

C、风险管理计划

D、沟通管理计划

我的答案：B　参考答案：C

135、(6196)在项目执行过程中发生为期一周的延期。项目经理确定批准加班将夺回时间损失，但是，项目管理办公室（PMO)的政策禁止加班。
项目经理应该怎么做？

A、提交变更请求

B、使用额外的资源

C、将延期情况通知项目团队

D、更新项目进计划

我的答案：A　参考答案：A

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

136、(6197)在最终交付一个项目前一周，项目经理发现了由技术团队造成的一个错误。这个错误将导致延期三个月
若要解决这个问题，项目经理应该参阅下列哪一项？

A、项目管理信息系统（PMIS)

B、应急计划

C、技术绩效测里

D、变更控制过程

我的答案：D　参考答案：D

137、(6198)项目经理被任命管理一家电信公司的全球项目。该公司拥有管理此类项目的专业知识，但项目经理却是刚接触该职位。
项目经理应如何提高其成功交付此项目的个人机会？

A、查询之前类似项目的经验教训
B、与项目关键干系人一起查看项目管理计划
C、召开项目关系人会议
D、执行全面风险分析

我的答案：A　参考答案：A

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

138、(6199) 一个项目需要由一个国外供应商的战略材料。项目经理了解到该材料预期将涨价，将会影响项 目预算。项目团队找到一家销售这种材料的本地供应商，可以以合理的价格满足项目技术规范。
项目经理下一步应该怎么做？

A、使用新价格更新成本基准
B、执行固定总价合同（FFP）
C、登记一项新风险，并计划减轻潜在的涨价风险
D、提交变更请求，从本地供应商采购材料

我的答案：B　参考答案：B

139、(6200)一名新项目经理被任命管理一个正在进行当中的项目，这个项目是要升级一家大型工厂以容纳新的产品线。为确保成功完成项目，项目经理应该做什么？

A、更新干系人管理计划，包含新生产部经理的期望以及对项目的影响
B、介绍生产部经理与市场营销项目发起人见面，了解项目基本情况
C、向生产部经理发送一份项目章程副本，向其通知项目情况
D、与生产部经理面谈，了解他们的优先顺序并理解项目

我的答案：A　参考答案：D

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

140、(6201)审查项目进度时，项目经理发现关键路径上的一项活动超出了估算时间。项目经理将该问题记录在项目问题日志中。
为了恢复项目进度，项目经理下一步该怎么做？

A、调整时间提前量和滞后量
B、更改进度基准
C、快速跟进活动
D、赶工

我的答案：D　参考答案：D

141、(6202)项目经理收到客户的一封请求变更紧急邮件，项目经理接下来应该怎么做？

A、记录请求并开始变更请求过程

B、要求项目发起人紧急批准

C、实施变更，然后通知变更控制委员会

D、评估变更请求，并继续进行变更

我的答案：A　参考答案：A

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

142、(6203)一名具有关键技术技能的团队成员对项目管理方式不认可。项目经理首先应该做做什么？

A、与该名团队成员私下讨论该问题

B、继续项目，因为这不影响项目进度

C、认可团队成员对项目的贡献和能力

D、在团队会议上解决团队成员的问题

我的答案：A　参考答案：A

143、(6204)项目经理与客户一起进行检查，可交付成果符合验收标准并达到了客户的满意。这些行动是下列哪一过程的一部分？

A、控制质量

B、项目或阶段收尾

C、控制范围

D、确认范围

我的答案：D　参考答案：D

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

144、(6205)项目干系人发生变化时，为保持有效沟通，项目经理应更新哪份计划？

A、范围管理

B、需求管理

C、项目管理

D、人力资源管理

我的答案：C　参考答案：C

145、(6206)买方准备正式授权完成一个项目。项目经理应查阅哪一份文件来确认正式采购收尾要求?

A、采购谈判
B、采购审计
C、采购工作说明书（SOW）
D、采购管理计划

我的答案：D　参考答案：D

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

146、(6207)一位经验丰富的项目经理负责管理一个IT项目，该项目与其他公司项目类似。项目经理可以参阅的好资源是什么?

A、经验教训
B、风险登记册
C、质量测量指标
D、持续改进

我的答案：A　参考答案：A

147、(6208)新项目经理替换了创建项目管理计划的项目经理。与项目团队一起审查状态报告后，新项目经理发现关键可交付成果不包含在范围书中。
新项目经理下一步该怎么做?

A、更新项目管理计划，包含忽略的可交付成果
B、制定一份新的项目管理计划，并请求批准
C、查阅风险登记册
D、查阅变更管理计划，并应用该流程到提议的范围变更

我的答案：D　参考答案：D

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

148、(6209)
客户要求生产50000台风扇，制造公司的项目经理正在制定质量管理计划。项目经理应使用下列哪一项来减少缺陷并让产品质量达到最大化?

A、帕累托图
B、控制图
C、因果图
D、直方图

我的答案：A　参考答案：A

149、(6210)在一个软件项目的执行阶段，项目团队发现每四个集成测试周期持续时间为四周，而非两周。 为减少对项目进度计划的影响，团队负责人建议执行并行测试周期。
项目经理下一步应该怎么做？

A、审查质量管理计划
B、开展实施质量保证过程
C、与全部项目干系人一起执行质量审计
D、将四个测试周期减少为两个

我的答案：A　参考答案：A

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

150、(6211)一家汽车公司发布一款新车型，但在最后一刻对车身外形式样做了变更。项目管理计划中哪些 元素可能会受到影响？

A、需求，进度计划和风险管理计划
B、风险管理计划，成本和范围基准
C、质量，干系人和采购管理计划
D、需求，质量和沟通管理计划

我的答案：B　参考答案：D

151、(6212)项目实施后，项目干系人向项目经理报告缺陷超出阈值。若要避免这个问题，项目经理应该在事先做什么？

A、记录质量控制措施
B、执行实施整体变更控制过程
C、执行过程改进
D、管理项目干系人的期望

我的答案：C　参考答案：C

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

152、(6213)
在项目执行期间，一家环境组织提出一个问题，迫使施工停止，并因此导致项目进度延迟。
下列哪一项应已经强调该问题？

A、干系人分析
B、沟通管理计划
C、干系人登记册
D、范围基准更新

我的答案：C　参考答案：C

153、(6214)一名新项目经理负责管理一个处于执行阶段的项目。为避免中断正在进行中的工作，项目经理应该怎么做？

A、更新变更控制日志
B、实施整体变更控制过程
C、修订干系人登记册
D、审查风险登记册

我的答案：D　参考答案：D

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

154、(6215)在项目启动大会上，一名关键干系人要求澄清项目对公司目标的影响。项目经理可以从哪里找到这个信息？

A、项目管理计划
B、项目章程
C、项目进度计划，预算和质量要求
D、事业环境因素

我的答案：B　参考答案：B

155、(6216)项目经理了解到从另一个国家采购的货物交付可能延期四周时间。项目经理应该怎么做？

A、向保险公司索赔
B、取消订单，并向别的供应商下新订单
C、审查项目管理计划，并通知项目干系人
D、汇报该问题给项目发起人

我的答案：C　参考答案：C

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

156、(6217)
作为具有两个组件的新产品设计团队一员，一名团队成员负责评估与组件B有关的质量问题。 下列哪一项用来识别可能影响生产过程的因素？

A、亲和图
B、实验设计
C、关联图
D、树图

我的答案：B　参考答案：B

157、(6218)一个项目已执行两年时间，项目团队遇到一个不可能克服的技术问题。项目发起人取消项目，因为项目超出预算，且如果不能解决这个问题，将无法继续进行。
项目团队接下来应该怎么做？

A、等待项目经理确定下一步行动
B、在最终项目报告中记录取消原因
C、继续调查问题，确定是否能够解决
D、将项目文件归档以备将来使用

我的答案：B　参考答案：B

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨

158、(6219)项目经理负责管理一个已定义范围的项目，项目发起人要求在两周内提交项目状态报告。
项目经理应该怎么做？

A、审查范围，并交付绩效结果
B、与团队开会，收集信息
C、审查沟通渠道
D、向项目发起人申请更多时间

我的答案：A　参考答案：B

159、(6220)项目的成本绩效指数（CPI)已经在0.89和0.93之间，项目的状态是什么？

A、项目落后于进度
B、项目符合进度
C、项目超出预算
D、项目低于预算

我的答案：C　参考答案：C

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

160、(6221)项目经理发现由于现有立法，一项功能不能按计划实施，这将严重影响项目基准。
若要避免这个问题，项目经理应该事先做什么？

A、花更多的时间创建详细的沟通管理计划
B、实行更严格的变更请求控制
C、雇佣经验更丰富的供应商团队
D、在项目启动期间识别假设条件和制约因素

我的答案：D　参考答案：D

161、(6222)项目经理负责管理一个为期三个月的项目，而项目发起人已经为该项目招募了项目团队成员。项目开展一个月后，项目经理发现某些团队成员的表现不及预期。
项目经理应该怎么做？

A、与表现不佳的成员面谈
B、遵循人力资源管理计划
C、替换表现不佳的成员
D、参考风险管理计划

我的答案：B　参考答案：B

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

162、(6223)项目经理批准一个产品发布的一项增强功能。这应记录在哪一份文件中？

A、项目章程
B、变更日志
C、工作说明书（SOW）
D、变更请求

我的答案：B　参考答案：B

163、(6224)项目状态会议后，项目经理了解到一项关键路径活动显示严重延期，增加了项目的风险水平。项目发起人密切监控成本绩效指数(CPI)，其值在项目生命周期未曾超过0.86。
若要将项目拉回正轨，项目经理应该怎么做？

A、应用赶工技术
B、根据延期情况制定一个新基准
C、应用快速跟进技术
D、重新分配具有浮动时间任务上的拥有类似技能的资源

我的答案：D　参考答案：C

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

164、(6225)分包商无法履行合同，结果导致项目整合延期，且项目将无法按时完成。
项目经理应该怎么做？

A、审查风险应对计划
B、审查分包商的承诺
C、变更进度基准，并通知客户
D、签发变更请求

我的答案：A　参考答案：A

165、(6226)由于不明原因，项目的进度开始偏移。项目经理如何调查这个问题？

A、观察与交谈
B、问答环节
C、过程核对表（progress checklist）
D、团队满意调查

我的答案：A　参考答案：C

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

166、(6227)项目正在进行当中，项目经理从公司离职，任命一名新的项目经理。发起人让新项目经理检查一名关键干系人修改请求的状态。项目经理可以从哪里找到这个信息？

A、项目文件更新
B、变更日志
C、干系人管理计划
D、沟通管理计划

我的答案：B　参考答案：B

167、(6228)制定人力资源管理计划的主要目的是什么？

A、确定如何定义、配备、管理和解散项目人力资源
B、确认人力资源可用性并获得必要的团队完成项目活动
C、描述如何以及何时分配项目团队成员以及需要他们多长时间
D、为团队绩效控制和人力可用性提供指导

我的答案：A　参考答案：A

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

168、(6229)一个已完成的项目已进入运营一个月，且在接受的采用范围内。但是，项目的最终发票未获接受。
项目经理应该怎么做？

A、识别新功能的需求
B、获得财务、法律和行政收尾
C、确定上线日期之后发生了哪些问题
D、与财务部开会

我的答案：B　参考答案：B

169、(6230)项目经理评估了提交给发起人、业务分析师、产品设计师的问卷调查结果。该问卷调查的目的是为了定义和澄清业务需求，以及将业务目标和战略保持一致。
这项行动属于下列哪一个知识领域？

A、项目整体管理
B、项目范围管理
C、制定项目章程
D、启动项目

我的答案：B　参考答案：B

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

170、(6231)与有限资源合作的项目发起人要求项目经理分析项目的质量成本，优化产品质量。为满足项目发起人的需求，项目经理应考虑哪些一致性成本？

A、预防和评价成本
B、IPOC模型
C、内部和外部失败成本
D、成本效益分析

我的答案：A　参考答案：B

171、(6232)

挣值（EV)	600美元
实际成本（AC)	100美元
计划价值（PV)	150美元
完工预算（BAC)	1800美元
完工尚需估算（ETC)	300美元

项目干系人希望理解已完成80%项目的绩效。假设项目以相同速度绩效，并使用表中的数字，项目的完工估算（EAC)是多少？

A、100美元
B、300美元
C、380美元
D、400美元

我的答案：C　参考答案：B

172、(6233)客户验收最终可交付成果后，项目经理分发最终项目报告，收集项目文件用于存档，并与团队开展经验教训会议，还需要完成什么活动？

A、收集工作绩效信息
B、更新问题日志
C、衡量并记录客户满意度
D、记录纠正措施

我的答案：C　参考答案：C

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

173、(6234)项目经理对无效率的团队周会感到失望。一些发言更为积极的团队成员都将会议转向他们认为有问题的领域进入长时间的讨论。
若要提高会议的效率，项目经理应该怎么做？

A、增加会议时间
B、不让发言更为积极的团队成员参加会议
C、确保没有团队成员感觉受到伤害
D、设定明确的议程，为每个事项限制具体的时间

我的答案：D　参考答案：D

174、(6235)当恶劣天气导致进度偏移时，客户感到担忧。项目经理应在何时执行相应的应急应对策略？

A、提供资金用于获得额外资源时
B、客户同意延长进度计划时
C、预测到恶劣天气时
D、发生恶劣天气后立即执行

我的答案：C　参考答案：C

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

175、(6236)项目接近完工，此时项目团队得知即将安装产品的所在地区即将实施新法规。项目经理决定为确保遵守新法规，必须添加一项新功能，而这将影响到资源、进度计划和预算。
如遵守这项新法规，需要下列哪一项来沟通和应用于需要的活动？

A、风险分解结构（RBS）
B、变更控制
C、问题日志
D、过程分析

我的答案：B　参考答案：B

176、(6237)项目经理的多学科团队分布在几个国家。每个团队都已准备了各自的预算和资源需求。现在必须融合在一起并与项目章程的估算预算进行对比。
项目经理下一步应该怎么做？

A、寻求项目发起人的批准
B、召开项目启动大会
C、收集信息并最终确定预算
D、审查计划并记录成本

我的答案：C　参考答案：C

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

177、(6238)项目经理被任命管理一个现有项目。他了解到团队A负责收集需求，团队B负责实施这些需 求，而团队C负责制定测试计划。
这应记录在哪一份文件中？

A、职能型矩阵
B、人员配备管理计划
C、组织分解结构
D、执行、负责、咨询和知情（RACI)矩阵

我的答案：D　参考答案：D

178、(6239)　在项目执行期间，项目团队对如何使用一项新技术产生误解。结果需要大量返工，导致整体成 本增加。
项目经理可以从什么渠道获得额外的返工资金？

A、关键干系人
B、管理储备
C、应急储备
D、项目发起人

我的答案：C　参考答案：B

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

179、(6240)在执行一个处于落后于进度风险的项目期间，项目经理了解到，某个项目提前完成，公司中技能最高的资源将可用，项目经理坚持让该资源立即分配到他们的项目团队，期望为项目带来积极影 响
项目经理应用的是什么策略？

A、分享
B、接受
C、转移
D、开拓

我的答案：D　参考答案：D

180、(6241)项目经理A认识到需要额外资源来按时完成项目，并请求项目经理B提供资源方面的协助。如 果项目经理B同意，应审查哪一份文件？

A、项目人员配备
B、资源日历
C、项目组织图
D、团队绩效评估

我的答案：B　参考答案：B

181、(6242)在装配线上工作时，一名团队成员报告了产品的高失败率。项目经理应该使用什么来支持该证据？

A、改善方法
B、名义小组技术
C、质量测量指标
D、力场分析

我的答案：C　参考答案：C

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论


182、(6243)对于一个在A国的系统实施项目，项目经理完成了范围定义的可交付成果，且获得客户验收。 该系统之前已成功在多个其他国家实施。但是A国的用户对某些功能不满意。
收尾项目时，项目经理下一步应该怎么做？

A、查阅风险登记册，获得减轻策略
B、与用户开会，了解他们不满意之处
C、组织一次经验教训会议，为经验教训知识库收集反馈
D、为客户和用户提供所有项目支持文档，确保满足项目目标并通过验收

我的答案：C　参考答案：C

184、(6245)网络图：
图中所示的进度计划关键路径是什么？

发送图片到手机

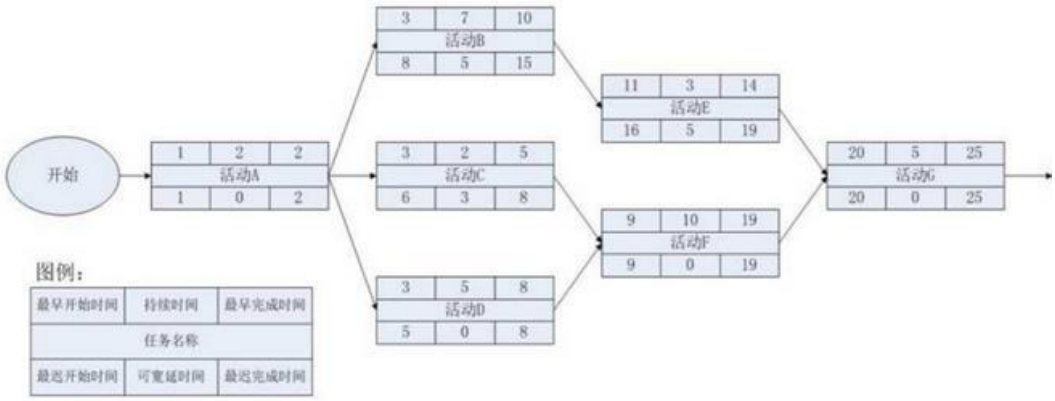

A、A-B-E-G
B、A-B-F-G
C、A-D-F-G
D、A-C-F-G

我的答案：C　参考答案：C

183、(6244)项目团队正在努力确定项目管理计划范围基准组织部分。应将哪份文件包含在内？

A、工作分解结构（WBS）词典
B、风险管理计划
C、成本管理计划
D、范围管理计划

我的答案：A　参考答案：A

185、(6246)一个由公司内部团队以及供应商共同开发的项目正经历问题，因此，公司总裁雇佣了一名新项目经理。在第一次项目评审期间，新项目经理发现在第一阶段，未规定关键项目可交付成果且未确定项目阶段。项目经理接下来应该怎么做？

A、修改项目管理计划并尽快实施

B、集中于按照项目管理计划完成第一阶段的交付

C、与发起人和关键干系人一起确认项目范围

D、更新项目章程并获得关键干系人的支持

我的答案：C　参考答案：D

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

186、(6247)进入执行阶段之前，项目经理准备向关键干系人提交项目管理计划。获得干系人对计划的批准，将确保下列哪一项？

A、干系人承诺进入到该项目中的资源

B、将最佳资源分配到项目中

C、项目将被完成

D、项目将符合合同时间和预算要求

我的答案：D　参考答案：A

187、(6248)承包商落后于进度计划，请求项目经理授权加班工作。项目经理首先应该做什么？

A、批准承包商的请求

B、拒绝请求

C、请求变更控制委员会（CCB)批准

D、审查事业环境因素

我的答案：D　参考答案：D

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

188、(6249)公司决定与一个供应商签署一份固定总价（FFP)合同，实施一个在线银行系统。这使用的是 什么风险应对策略？

A、转移

B、回避

C、开拓

D、接受

我的答案：A　参考答案：A

189、(6250)项目经理从一家公司的高级管理层收到一份商业论证。该公司之前曾有在项目执行阶段中途放弃项目且不能提供足够要求资源的历史。
项目经理应该怎么做？

A、制定工作分解结构（WBS）
B、制定项目章程
C、制定项目管理计划
D、制定战略计划

我的答案：B　参考答案：B

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

190、(6251)根据沟通管理计划，项目经理安排每周的团队会议。一些团队成员报告时间有冲突，错过了一些会议。项目经理下一步应该做什么？

A、开会时为所有会议做备忘录
B、会议安排在所有团队成员都可行的时间
C、确认开会时间与所有团队成员一致有困难
D、将会议调整为两周一次

我的答案：C　参考答案：A

191、(6252)来自顾问公司的项目经理接管了客户预先批准的项目。提交可交付成果时，发现成本被低估了。项目经理将这个错误报告给了高级经理，高级经理强调该项目对公司至关重要。
项目经理下一步应该怎么做？

A、在项目管理计划中的后期阶段，增加一个重新估算任务
B、评估减少范围的方案，与预算对比
C、将该错误上报给项目发起人
D、应用应急管理储备

我的答案：A　参考答案：B

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

192、(6253)若要向关键干系人沟通项目管理计划，宣布项目开始，并分享相关信息，项目经理应该使用什么沟通工具？

A、状态报告
B、每日站立会议
C、焦点小组会议
D、项目启动大会

我的答案：D　参考答案：D

193、(6254)项目经理怀疑最近生产的产品批次中存在一个质量缺陷。但是，对这个缺陷执行测试对产品将是破坏性的。公司下一步应该怎么做？

A、对该产品批次执行实验设计

B、从产品批次中随机选择几组来测量缺陷的范围

C、使用预先定义的验收标准执行统计抽样

D、发布当前批次产品，按打折价销售

我的答案：C　参考答案：C

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

194、(6255)在项目成功完工之后的客户收尾会议上，客户经理通知项目经理即将到来一个类似项目，成本需要在一个小时内提交给项目发起人。项目经理应使用什么估算方法？

A、类比估算

B、粗略量级估算

C、参考性估算

D、全面方案估算

我的答案：A　参考答案：A

195、(6256) 收到供应商建议书后，项目经理应使用什么来确保最低报价在当前市场范围内？

A、独立估算

B、建议书评价技术

C、专家判断

D、分析技术

我的答案：A　参考答案：A

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

196、(6257)项目经理审查进度绩效，并计算出已完成工作的实际成本（AC)是220,成本偏差（CV)为- 20,,以及计划价值为180。项目的进度偏差(SV)是多少？

A、-40

B、-20

C、20

D、40

我的答案：C　参考答案：C

197、(6258)设备供应商通知项目经理交付延迟。项目经理认识到该延迟将影响到整个项目。为了保持项目进度计划，项目经理决定缩短设备安装时间。
项目经理下一步应该怎么做？

A、确定项目关键路径
B、管理供应商合同
C、修订项目进度计划
D、提交变更请求

我的答案：A　参考答案：A

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

198、(6259)为了识别项目可交付成果微小缺陷，项目经理使用了一种昂贵的质量测试程序。如果能识别这些小缺陷，可交付成果将更可能验收，且返工成本也将更低。在执行质量测试之前项目经理应该怎首先？

A、通知项目团队将质量测试包括进质量成本
B、针对该质量测试执行成本-效益分析
C、监控并调查缺陷
D、使用设计审查方法为质量测试分析

我的答案：B　参考答案：B

199、(6260)一位顾问告知项目经理，一名内部客户资源正在为项目工作，并希望获知项目状态。哪份文件应更新？

A、组织图
B、采购合同
C、沟通管理计划
D、会议记录

我的答案：C　参考答案：C

查看详情　补充题解　加入收藏　加入班级讨论

200、(6261)在项目执行阶段，项目经理被替换了。管理层、客户和项目团队成员都对项目的沟通方面不满意。项目经理首先应该怎么做？

A、更新沟通管理计划
B、查阅干系人登记册
C、创建项目管理信息系统
D、制定干系人管理计划

我的答案：A　参考答案：A
